

# 公費解体の進捗状況（令和6年9月末）




資源循環推進課 076(225)1471

- 解体見込み棟数32,410棟の 約16%である 5,096棟の解体が完了
- 9月末までの解体計画 5,432棟に対し、達成率は 94%
- 9月の解体棟数は、8月よりも約500棟増加したが、令和6年奥能登豪雨の影響により、9月の計画棟数より336棟下回った

R6.10.1時点の  
解体班数 998班

|      |                    | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6  | R6.7  | R6.8  | R6.9  | R6.10 | R6.11  | R6.12  | R7.1   | R7.2   | R7.3   | R7.4   | R7.5   | R7.6   | R7.7   | R7.8   | R7.9   | R7.10  |
|------|--------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 解体計画 | 解体班数※              | 8    | 56   | 120  | 291   | 601   | 650   | 950   | 1,060 | 1,120  | 1,120  | 1,120  | 1,120  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,000  | 1,000  | 750    | 486    |
|      | ①解体棟数（各月）※         | 15   | 163  | 288  | 610   | 1,112 | 1,208 | 2,036 | 2,348 | 2,400  | 2,265  | 1,969  | 1,841  | 2,315  | 2,392  | 2,392  | 2,315  | 2,213  | 1,859  | 1,593  | 1,076  |
|      | ②"（累計）※            | 15   | 178  | 466  | 1,076 | 2,188 | 3,396 | 5,432 | 7,780 | 10,180 | 12,445 | 14,414 | 16,255 | 18,570 | 20,962 | 23,354 | 25,669 | 27,882 | 29,741 | 31,334 | 32,410 |
|      | 解体率（累計）※           | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 3.3%  | 6.8%  | 10.5% | 16.8% | 24.0% | 31.4%  | 38.4%  | 44.5%  | 50.2%  | 57.3%  | 64.7%  | 72.1%  | 79.2%  | 86.0%  | 91.8%  | 96.7%  | 100%   |
| 解体実績 | ③解体棟数（各月）          | 15   | 163  | 288  | 610   | 1,112 | 1,208 | 1,700 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | ④"（累計）             | 15   | 178  | 466  | 1,076 | 2,188 | 3,396 | 5,096 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | 解体率（計画棟数あたり）       | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 3.3%  | 6.8%  | 10.5% | 15.7% |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | 計画達成率（各月）<br>（③÷①） | —    | —    | —    | —     | —     | 100%  | 83%   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      | 計画達成率（累計）<br>（④÷②） | —    | —    | —    | —     | —     | 100%  | 94%   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

※R6.3～R6.7は実績を記載。自費解体・緊急解体の棟数を含む

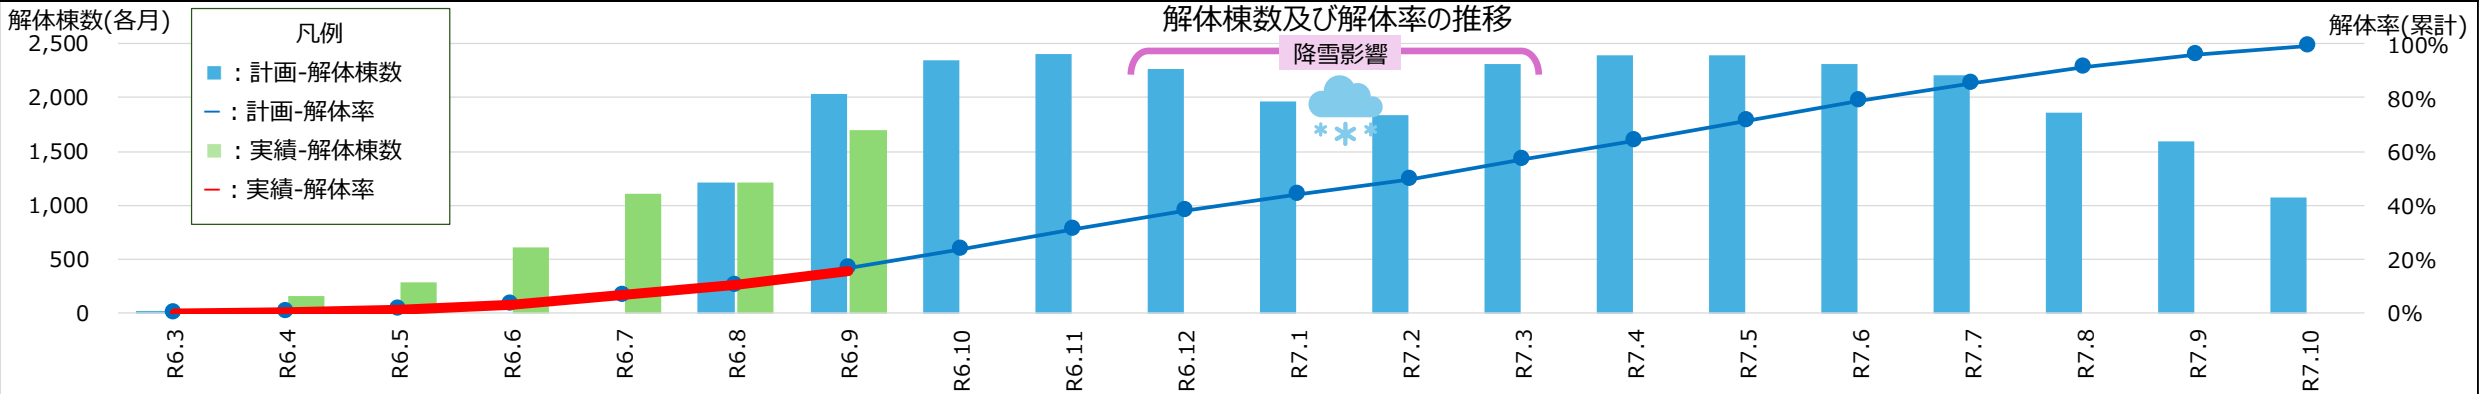

# 令和6年奥能登豪雨による公費解体への影響



- 発災時、安全のため、奥能登全域で公費解体作業を中断
- 順次、作業を再開したが、一部地域では現在も中断中

珠洲市・輪島市では、解体作業を実施できない解体班が、道路啓開などの復旧工事を実施

- 解体作業用の重機やダンプが水没・埋没
- 解体作業員の宿舎で床上浸水などが発生
- 解体工事再開後も、通行止めなどによる道路状況の悪化により、解体速度が低下
- 珠洲市、輪島市の仮置場で浸水が発生（現在は、全て復旧）



輪島市の公費解体  
仮置場の浸水状況

輪島市町野町

9月末の計画解体棟数を336棟下回った



珠洲市の解体現場

珠洲市大谷町

## 対応

- 解体作業が実施できる家屋へ解体班を配置変更済み
- 今後、豪雨による今後の影響も見極めながら、令和7年10月の解体完了に向け解体班数を増強していく

# 令和6年奥能登豪雨における災害廃棄物処理の特例



豪雨に伴う災害廃棄物処理への支援拡充について、国へ要望していたところ、震災からの復旧途上に豪雨被害が生じたことを踏まえ、特例的に、

- ・ 能登半島地震と同水準の財政支援 を行うとともに、
- ・ 半壊以上の家屋の解体を支援対象 とする方針が示された。

|         | 令和6年能登半島地震 | 令和6年奥能登豪雨       |
|---------|------------|-----------------|
| 災害の区分   | 特定非常災害     | 激甚災害（指定見込）      |
| 国の財政支援  | 最大99.7%    | 95.7% → 最大99.7% |
| 公費解体の対象 | 半壊以上       | 全壊 → 半壊以上       |

特例的に、特定非常災害である能登半島地震と同水準に拡充

地震と豪雨による災害廃棄物の一体的な処理が可能となり、仮置場での保管や運搬、処理を区別せずに行うことができ、迅速かつ円滑な処理につながる

# (参考) 市町別の公費解体の状況 (令和6年9月末)



| 市町  | 解体見込棟数※1<br>(R6.8) A | 申請棟数※1 | 着手棟数※1 | 完了棟数<br>B ※2 | 公費解体  | 緊急解体 | 自費解体 | 解体率<br>B÷A |
|-----|----------------------|--------|--------|--------------|-------|------|------|------------|
|     |                      |        |        |              |       |      |      |            |
| 珠洲市 | 7,195                | 6,322  | 3,046  | 1,681        | 1,567 | 106  | 8    | 23.4%      |
| 輪島市 | 9,685                | 9,256  | 4,289  | 874          | 638   | 217  | 19   | 9.0%       |
| 能登町 | 2,759                | 2,643  | 1,259  | 471          | 460   | 2    | 9    | 17.1%      |
| 穴水町 | 2,451                | 2,454  | 1,158  | 621          | 611   | 0    | 10   | 25.3%      |
| 七尾市 | 3,500                | 3,561  | 1,680  | 421          | 253   | 0    | 168  | 12.0%      |
| 志賀町 | 4,012                | 3,438  | 1,875  | 472          | 306   | 9    | 157  | 11.8%      |
| その他 | 2,808                | 2,366  | 1,205  | 556          | 338   | 4    | 214  | 19.8%      |
| 合 計 | 32,410               | 30,040 | 14,512 | 5,096        | 4,173 | 338  | 585  | 15.7%      |

※1 緊急解体・自費解体を含む

※2 完了棟数は、家屋等の解体が終了したものを示す

ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す

# 自費解体の促進に向けた取り組みについて



## 自費解体つなぎ資金利子助成制度の創設（10月10日～）

- 自費解体（所有者が解体費用を立替えし、後日市町から払戻し）にあたり、自己資金がない場合に、金融機関から借入れた際の利子を助成します。

対 象

自費解体の資金を金融機関から借り入れた個人

内 容

借入に係る利子を全額助成

※ 最大5か月分、利率・助成額上限なし、既に借入れ・返済済みの場合も対象

受 付

石川県生活環境部資源循環推進課（076-225-1474）

つなぎ資金を借入れ  
できる金融機関を  
県ホームページで紹介



<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/info/rishi.html>

## 自費解体の業者に関する相談窓口（10月10日～）

- 自費解体の希望者向けに、自費解体を請け負う業者に関する相談に応じます。

石川県工務店協会

076-269-8103

9時～17時30分

（毎週水曜日、第1土曜日・日曜日、第3日曜日除く）

事務局：株式会社ひまわりほーむ

（一社）石川県構造物解体協会

076-256-1444

10時～15時（土日祝除く）
