


公費解体の進捗状況（令和6年11月末）



- 解体見込棟数32,410棟の **34.0%**となる **11,020棟**の解体が完了
- 11月単月 計画: 2,400棟 実績: 3,286棟 達成率:**137%**
- 11月末累計 計画:10,180棟 実績:11,020棟 達成率:**108%**

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	
解体計画	解体班数	8	56	120	291	601	650	950	1,060	1,120	1,120	1,120	1,120	1,080	1,080	1,080	1,080	1,000	1,000	750	486	
	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	1,969	1,841	2,315	2,392	2,392	2,315	2,213	1,859	1,593	1,076	
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	14,414	16,255	18,570	20,962	23,354	25,669	27,882	29,741	31,334	32,410	
	解体率（累計）	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	16.8%	24.0%	31.4%	38.4%	44.5%	50.2%	57.3%	64.7%	72.1%	79.2%	86.0%	91.8%	96.7%	100%	
解体実績	③解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286												
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020												
	解体率（解体見込棟数あたり）	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	15.7%	23.9%	34.0%												
	計画達成率（各月） （③÷①）	—	—	—	—	—	100%	83.5%	112%	137%												
計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	93.8%	99.4%	108%													

解体班数
計画上の1,120班を上回る
1,211班(R6.11.26)

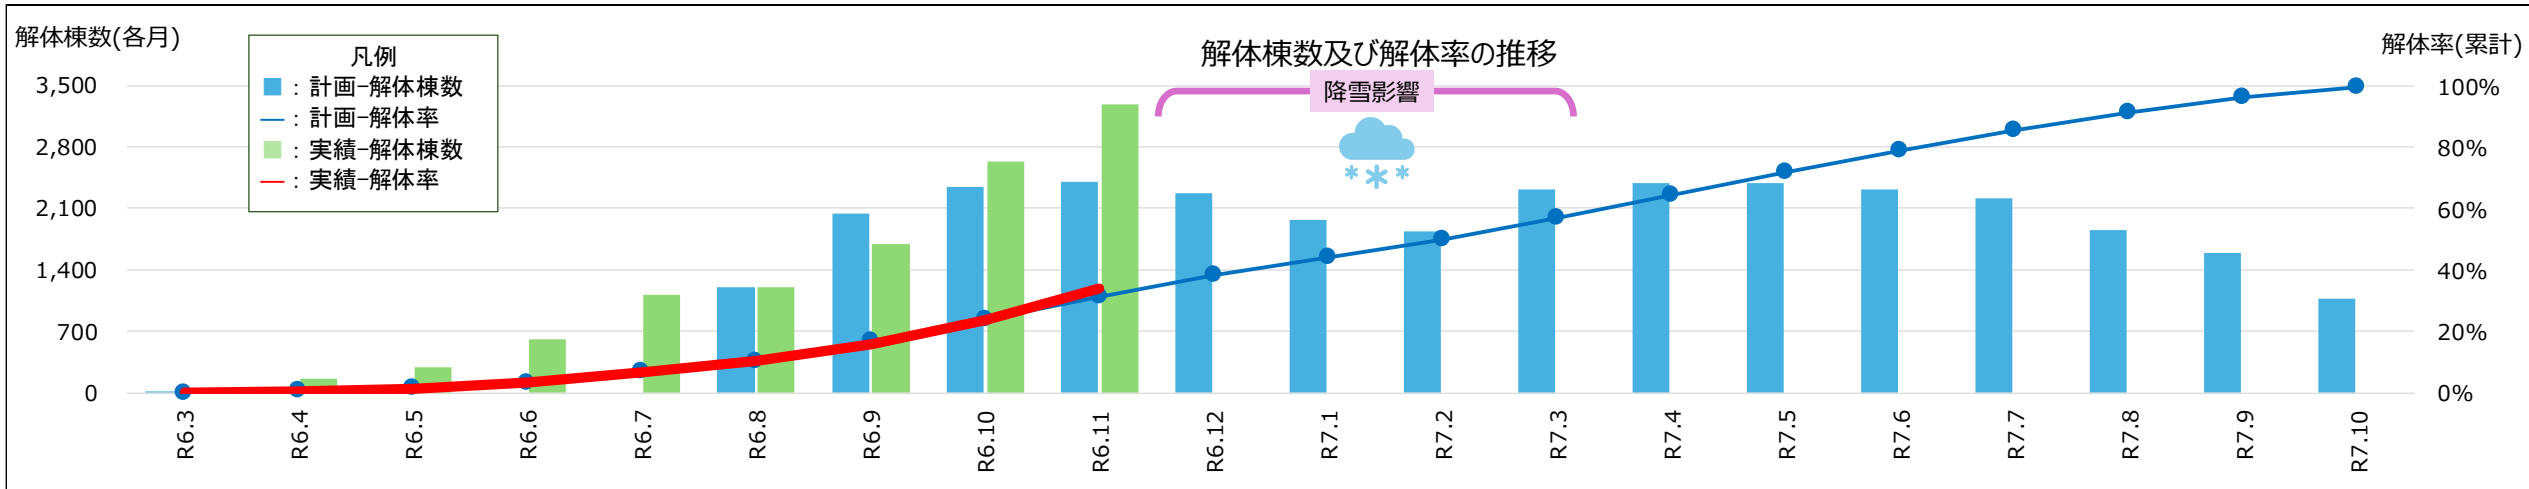

市町別の公費解体の状況（令和6年11月末）



市町	解体見込棟数※ (R6.8) A	申請棟数※	着手棟数※	完了棟数 B	解体の種類			解体率 B÷A
					公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	7,195	7,100	5,037	3,452	3,324	111	17	48.0%
輪島市	9,685	10,101	6,817	2,434	2,189	225	20	25.1%
能登町	2,759	2,999	2,155	997	970	2	25	36.1%
穴水町	2,451	2,545	1,741	1,081	1,069	0	12	44.1%
七尾市	3,500	4,196	2,995	1,016	779	0	237	29.0%
志賀町	4,012	3,791	2,742	1,092	880	9	203	27.2%
その他	2,808	2,679	1,674	948	668	4	276	33.8%
合 計	32,410	33,411	23,161	11,020	9,879	351	790	34.0%

解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。

ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。

※ 緊急解体・自費解体を含む
