


公費解体の進捗状況（令和6年12月末）



- 解体見込棟数32,410棟の **43.7%**となる **14,152棟**の解体が完了
- 12月単月 計画: 2,265棟 実績: 3,132棟 達成率:**138%**
- 12月末累計 計画:12,445棟 実績:14,152棟 達成率:**114%**

中間目標12,445棟
を上回った

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数	8	56	120	291	601	650	950	1,060	1,120	1,120	1,120	1,120	1,080	1,080	1,080	1,080	1,000	1,000	750	486
	①解体棟数(各月)	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	1,969	1,841	2,315	2,392	2,392	2,315	2,213	1,859	1,593	1,076
	②" (累計)	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	14,414	16,255	18,570	20,962	23,354	25,669	27,882	29,741	31,334	32,410
	解体率(累計)	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	16.8%	24.0%	31.4%	38.4%	44.5%	50.2%	57.3%	64.7%	72.1%	79.2%	86.0%	91.8%	96.7%	100%
解体実績	③解体棟数(各月)	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132										
	④" (累計)	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152										
	解体率(解体見込棟数あたり)	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	15.7%	23.9%	34.0%	43.7%										
	計画達成率(各月) (③÷①)	—	—	—	—	—	100%	83.5%	112%	137%	138%										
計画達成率(累計) (④÷②)	—	—	—	—	—	100%	93.8%	99.4%	108%	114%											

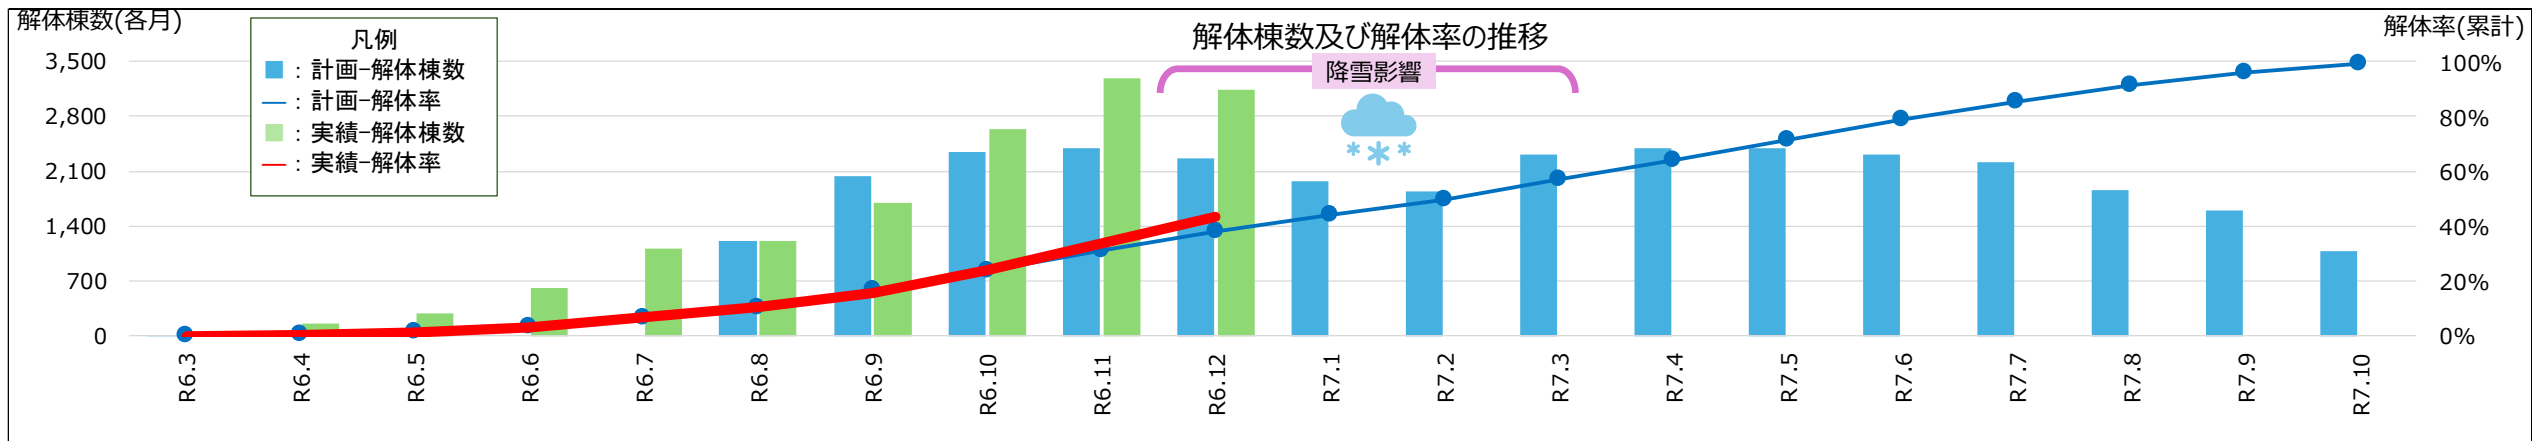

市町別の公費解体の状況（令和6年12月末）



市町	解体見込棟数※ (R6.8) A	申請棟数※	着手棟数※	完了棟数 B	完了棟数 B			解体率 B÷A
					公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	7,195	7,354	5,982	4,335	4,201	111	23	60.3%
輪島市	9,685	10,494	8,084	3,299	3,038	229	32	34.1%
能登町	2,759	3,113	2,558	1,276	1,238	2	36	46.2%
穴水町	2,451	2,573	2,018	1,389	1,367	0	22	56.7%
七尾市	3,500	4,501	3,825	1,280	1,013	0	267	36.6%
志賀町	4,012	3,947	3,141	1,386	1,170	9	207	34.5%
その他	2,808	2,857	1,939	1,187	872	4	311	42.3%
合計	32,410	34,839	27,547	14,152	12,899	355	898	43.7%

解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。

ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。

※ 緊急解体・自費解体を含む
