


公費解体の進捗状況（令和7年6月末）

- 公費解体申請棟数の **74.2%**となる **約3万2千棟**の解体が完了
（6月末累計 計画:30,509棟 実績:31,778棟 **達成率:104%**）
- 申請棟数の推移や、多くの市町で申請期限を迎えたことを踏まえ、国や市町と協議の上、**今月中を目途に、解体見込棟数等を見直し、「公費解体加速化プラン」の改定を行う**（見込棟数 **39,235棟** ⇒ 申請棟数 **42,854棟**）
- 解体見込棟数は増加するが、**今年10月の公費解体完了目標を維持**

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1改定】									
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	①解体見込棟数（単月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245
	②"（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235
	解体率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
解体実績	申請実績（累計）	3,087	10,557	17,119	21,767	25,212	28,198	30,040	31,865	33,411	34,839	36,304	37,188	38,825	40,029	41,674	42,854				
	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118				
	④"（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778				
	解体率（見込棟数あたり）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%	57.3%	66.3%	73.0%	81.0%				
	"（申請棟数あたり）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.1%	7.9%	11.9%	18.0%	25.7%	33.0%	39.9%	44.2%	52.5%	60.7%	66.9%	74.2%				
	計画達成率（単月）(③÷①)						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%	85%	104%				
	"（累計）(④÷②)	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%	104%	104%				

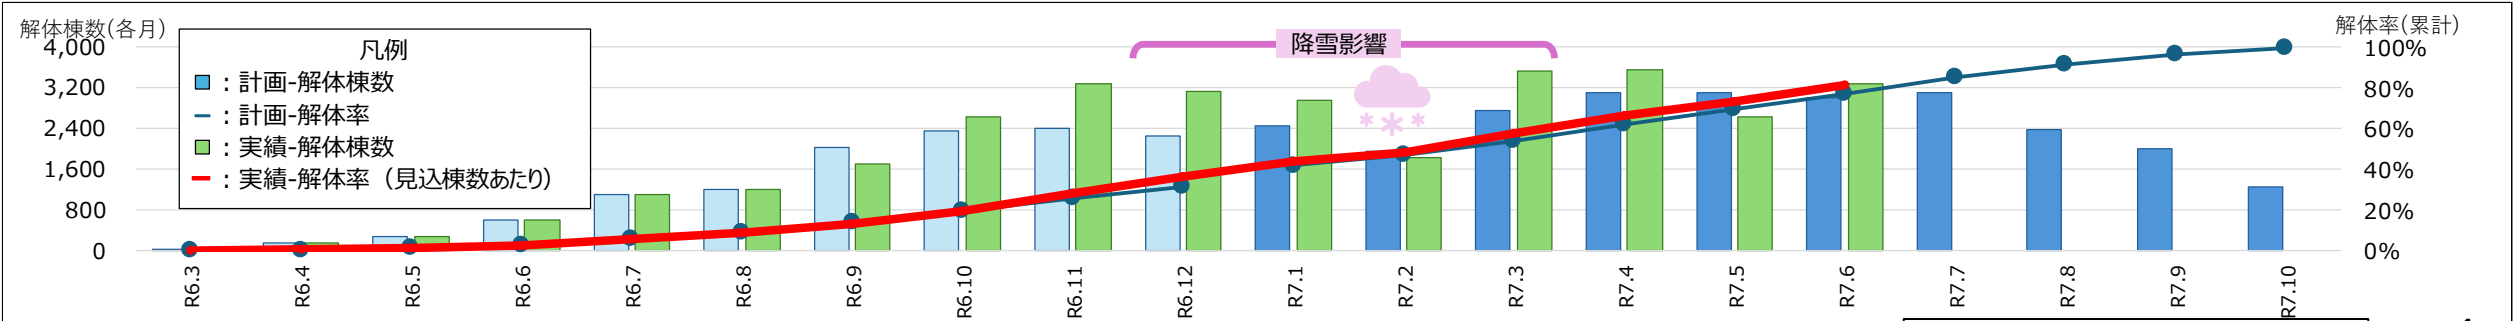

市町別の公費解体の進捗状況（令和7年6月末）



・穴水町の約9割、珠洲市、輪島市、志賀町の約8割で公費解体が完了

市町	解体見込棟数 〔R7.1〕A	申請棟数 B	完了棟数 C				見込棟数あたり 解体率 C ÷ A	申請棟数あたり 解体率 C ÷ B
				公費解体	緊急解体	自費解体		
珠洲市	8,023 〔43〕	8,343 〔47〕	6,879 〔13〕	6,725 〔13〕	111 〔0〕	43 〔0〕	85.7% 〔30.2%〕	82.5% 〔27.7%〕
輪島市	11,267 〔276〕	12,493 〔217〕	9,379 〔0〕	9,077 〔0〕	259 〔0〕	43 〔0〕	83.2% 〔0.0%〕	75.1% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	4,357 〔18〕	2,957 〔12〕	2,900 〔12〕	2 〔0〕	55 〔0〕	74.8% 〔75.0%〕	67.9% 〔66.7%〕
穴水町	2,703	2,796	2,452	2,418	0	34	90.7%	87.7%
七尾市	5,900	6,208	3,861	3,402	0	459	65.4%	62.2%
志賀町	4,233	4,919	3,726	3,333	9	384	88.0%	75.7%
上記以外の市町	3,158	3,738	2,524	2,124	4	396	79.9%	67.5%
計	39,235 〔335〕	42,854 〔282〕	31,778 〔25〕	29,979 〔25〕	385 〔0〕	1,414 〔0〕	81.0% 〔7.5%〕	74.2% 〔8.9%〕

※能美市、加賀市は、公費解体完了。公費解体は、14市町で実施中

資源循環推進課 076(225)1470

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数
