

# 公費解体の進捗状況（令和7年1月末）




- 解体見込棟数39,235棟の **43.6%**となる **17,112棟**の解体が完了
- 1月単月 計画: 2,450棟 実績: 2,960棟 達成率:121%
- 1月末累計 計画:16,602棟 実績:17,112棟 達成率:103%

加速化プラン【R6.8】

加速化プラン【R7.1改定】

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数	8	56	120	247	601	661	982	1,120	1,211	1,256	973	1,021	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	800	482
	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235
	解体実施率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	9%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960									
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112									
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%									
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%									
計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	100%	94%	99%	108%	114%	103%										

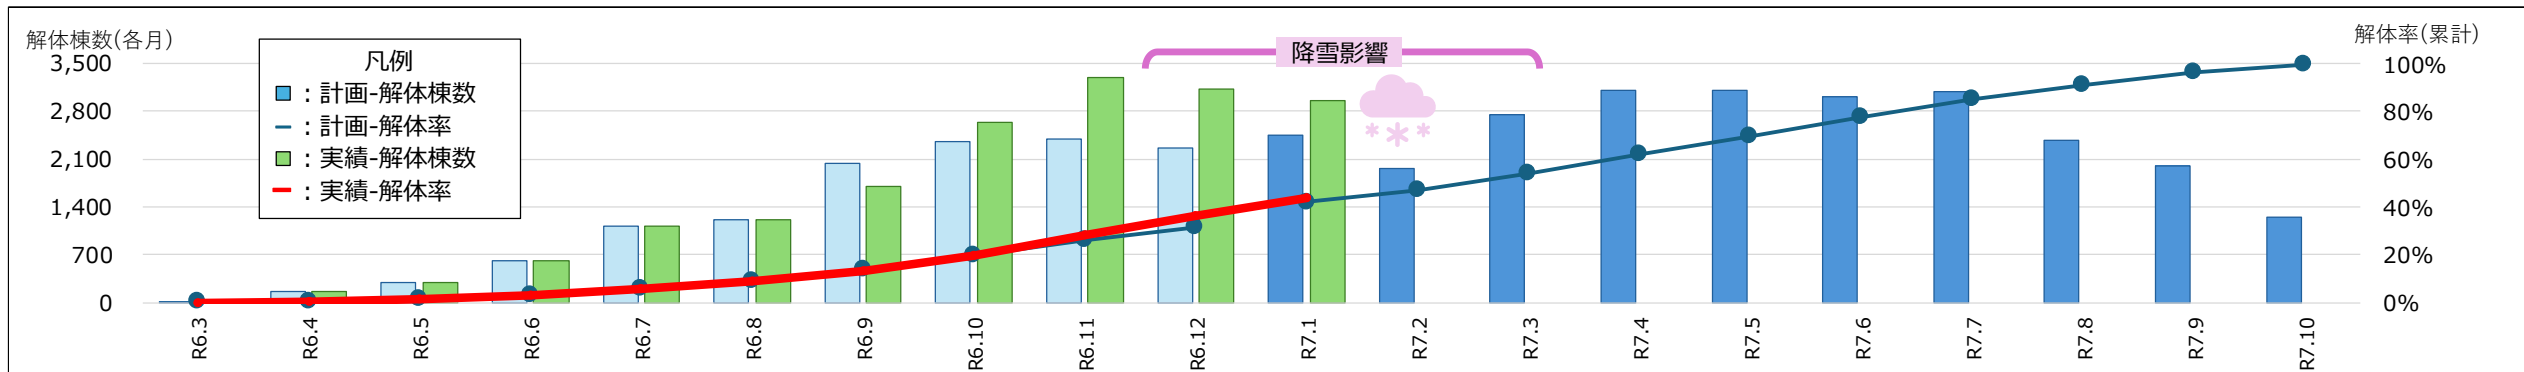

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

# 市町別の公費解体の状況（令和7年1月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.1〕A	申請棟数	完了棟数 B	完了棟数			解体率 B÷A
				公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	8,023 〔43〕	7,536 〔19〕	4,757 〔0〕	4,612 〔0〕	111 〔0〕	34 〔0〕	59.3% 〔0.0%〕
輪島市	11,267 〔276〕	10,721 〔53〕	4,578 〔0〕	4,315 〔0〕	229 〔0〕	34 〔0〕	40.6% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	3,491 〔7〕	1,561 〔0〕	1,519 〔0〕	2 〔0〕	40 〔0〕	39.5% 〔0.0%〕
穴水町	2,703	2,700	1,600	1,571	0	29	59.2%
七尾市	5,900	4,757	1,621	1,316	0	305	27.5%
志賀町	4,233	4,092	1,624	1,388	9	227	38.4%
その他	3,158	3,007	1,371	1,040	4	327	43.4%
計	39,235 〔335〕	36,304 〔79〕	17,112 〔0〕	15,761 〔0〕	355 〔0〕	996 〔0〕	43.6% 〔0.0%〕

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計  
〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数


# 災害廃棄物の処理状況（令和6年12月末・暫定値）



➤ 災害廃棄物の発生推計量410万トンの **27.6%**となる **113万トン**の処理が完了

（単位：千トン）

	R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
解体ごみの推計発生量（各月）			2	17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	327	251	212	132					
①処理量（各月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	273	261	261	273	259	221	29	14	8
② "（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,773	3,034	3,294	3,567	3,826	4,047	4,076	4,090	4,098
処理率（累計）	0.07%	0.40%	0.86%	1.4%	2.1%	3.1%	6.0%	8.8%	12%	17%	22%	28%	32%	36%	42%	48%	55%	61%	68%	74%	80%	87%	93%	99%	99%	99%	100%
③処理実績（各月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219															
④ "（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133															
処理率（発生推計量あたり）	0.07%	0.40%	0.86%	1.38%	2.1%	3.1%	5.9%	8.8%	12.3%	16.9%	22.3%	27.6%															
計画達成率（各月） （③÷①）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															

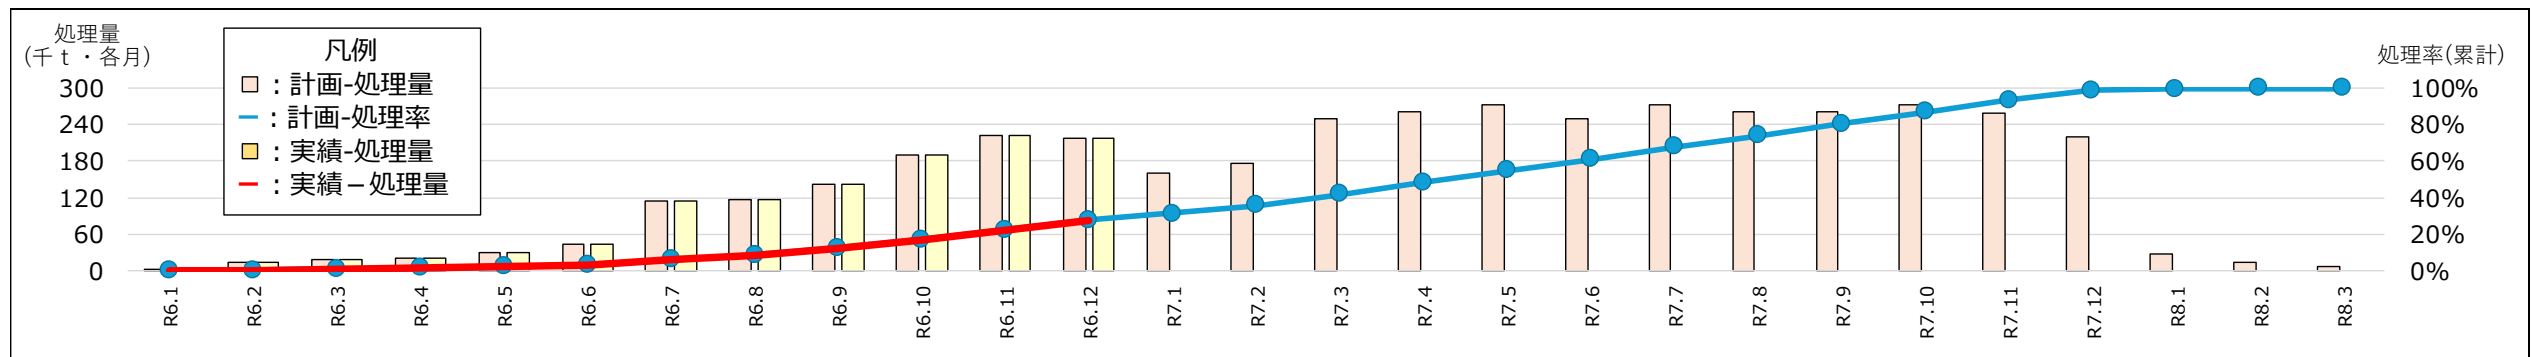

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和6年12月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	処理率 B÷A
珠州市	858.4	328.5 (100.0%)	43.3 (13.2%)	33.0 (10.1%)	133.2 (40.5%)	5.1 (1.6%)	113.6 (34.6%)	0.3 (0.1%)	38.3%
輪島市	1,131.5	319.4 (100.0%)	29.5 (9.2%)	38.9 (12.2%)	125.3 (39.2%)	8.5 (2.7%)	117.1 (36.6%)	0.1 (0.0%)	28.2%
能登町	411.1	103.0 (100.0%)	9.1 (8.8%)	21.5 (20.9%)	33.7 (32.7%)	3.0 (2.9%)	35.7 (34.6%)	0.1 (0.0%)	25.1%
穴水町	278.4	118.5 (100.0%)	15.6 (13.2%)	11.7 (9.9%)	62.7 (52.9%)	2.2 (1.9%)	26.3 (22.2%)	0.0 (0.0%)	42.6%
七尾市	632.1	106.7 (100.0%)	12.0 (11.3%)	17.5 (16.4%)	35.0 (32.9%)	2.9 (2.7%)	39.2 (36.7%)	0.0 (0.0%)	16.9%
志賀町	502.4	85.0 (100.0%)	4.7 (5.5%)	19.3 (22.7%)	38.6 (45.4%)	1.8 (2.1%)	20.6 (24.2%)	0.1 (0.1%)	16.9%
上記以外の市 町	283.7	71.8 (100.0%)	3.1 (4.3%)	13.9 (19.3%)	17.7 (24.7%)	1.9 (2.6%)	35.3 (49.1%)	0.0 (0.1%)	25.3%
合 計	4,097.6	1,132.9 (100.0%)	117.2 (10.3%)	155.9 (13.8%)	446.3 (39.4%)	25.3 (2.2%)	387.7 (34.2%)	0.6 (0.1%)	27.6%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

（ ）内は、種類ごとの割合、「その他」は、蛍光灯など
