


公費解体の進捗状況（令和7年8月末）



- 解体見込棟数 43,325棟（別管理建物を除く）の 82.1%となる 35,576棟の解体が完了
 - 8月単月 計画：2,584棟 実績：1,535棟 達成率：59.4%
 - 8月末累計 計画：36,811棟 実績：35,576棟 達成率：96.6%
- お盆休みによる解体休止や猛暑による作業効率の低下等のため、目標を下回った。

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1】						加速化プラン【R7.7】				解体見込棟数	別管理建物
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	44,953	1,628
解体計画	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	2,449	2,584	3,323	3,191		
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	34,227	36,811	40,134	43,325		
	解体実施率（累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.0%	7.8%	13%	18%	23%	29%	38%	43%	49%	56%	63%	70%	79%	85%	93%	100%		
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118	2,263	1,535				
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778	34,041	35,576				
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.1%	7.8%	11.8%	17.9%	25.4%	32.7%	39.5%	43.7%	51.9%	60.1%	66.2%	73.3%	78.6%	82.1%				
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%	84.8%	104%	92.4%	59.4%				
	計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%	104%	104%	99.5%	96.6%				

解体見込棟数
（別管理建物を除く）

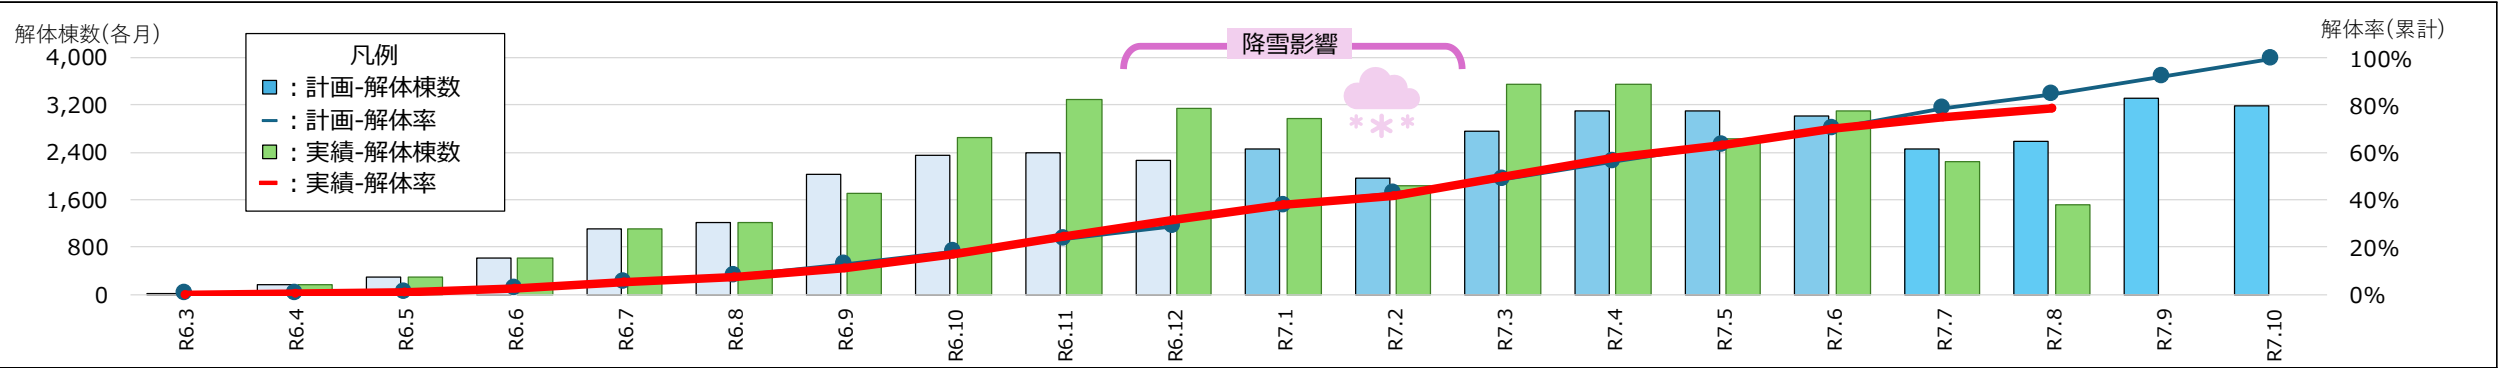

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計
※解体見込棟数は、加速化プラン【R7.7】の棟数。別管理建物の棟数は、最新値

市町別の公費解体の進捗状況（令和7年8月末）



・**珠洲市、輪島市、穴水町、志賀町の約9割**で公費解体が完了

市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕 A	申請棟数 B	完了棟数 C	公費解体	緊急解体	自費解体	別管理建物 D	解体率 (見込棟数あたり) C÷(A-D)	解体率 (申請棟数あたり) C÷(B-D)
珠洲市	8,499 〔57〕	8,431 〔57〕	7,446 〔27〕	7,291 〔27〕	111 〔0〕	44 〔0〕	114 〔30〕	88.8% 〔100%〕	89.5% 〔100%〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,507 〔219〕	10,379 〔25〕	10,075 〔25〕	259 〔0〕	45 〔0〕	901 〔0〕	87.2% 〔11.5%〕	89.4% 〔11.4%〕
能登町	4,456 〔18〕	4,496 〔18〕	3,536 〔18〕	3,458 〔18〕	2 〔0〕	76 〔0〕	24 〔0〕	79.8% 〔100%〕	79.1% 〔100%〕
穴水町	2,819	2,805	2,647	2,608	0	39	69	96.3%	96.7%
七尾市	7,500	7,077	4,414	3,906	0	508	187	60.4%	64.1%
志賀町	5,104	4,933	4,208	3,813	9	386	225	86.2%	89.4%
上記以外の市町	3,767	3,742	2,946	2,542	4	400	108	80.5%	81.1%
計	44,953 〔292〕	43,991 〔294〕	35,576 〔70〕	33,693 〔70〕	385 〔0〕	1,498 〔0〕	1,628 〔30〕	82.1% 〔26.7%〕	84.0% 〔26.5%〕

※能美市、小松市、加賀市は公費解体完了。能登町は豪雨分の公費解体完了。公費解体は、13市町で実施中
※別管理建物の棟数は、最新値。令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数
※解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。

災害廃棄物の処理状況（令和7年7月末・暫定値）




- 発生推計量（別管理建物を除く）377万トンの **73.1%**となる **276万トン**の処理が完了
- 7月単月 計画：17万トン 実績：16万トン 達成率：94%
- 7月末累計 計画：270万トン 実績：276万トン 達成率：102%

		加速化プラン【R7.1】												加速化プラン【R7.7】										全発生推計量	別管理建物						
		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	4,195	424	
処理計画※	解体ごみの推計発生量（単月）	1				17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	202	213	274	279						4,195	424
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	174	166	209	221	201	160	61	37	19			
	②　　"　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,696	2,863	3,072	3,293	3,493	3,653	3,714	3,752	3,771			
	処理率（累計）	0.07%	0.44%	0.93%	1.5%	2.3%	3.4%	6.5%	9.5%	13%	18%	24%	30%	34%	39%	46%	52%	60%	66%	72%	76%	81%	87%	93%	97%	98%	99%	100%			
処理実績	③処理実績（単月）	4	14	20	24	32	49	123	121	151	196	235	235	224	189	285	272	222	196	164											
	④　　"　　（累計）	4	18	37	61	94	142	265	386	538	734	969	1,203	1,427	1,616	1,902	2,174	2,396	2,592	2,756											
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.47%	0.99%	1.6%	2.5%	3.8%	7.0%	10.2%	14.3%	19.5%	25.7%	31.9%	37.8%	42.9%	50.4%	57.6%	63.5%	68.7%	73.1%											
	計画達成率（単月） （③÷①）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140%	107%	115%	104%	81.6%	79.0%	94.2%											
計画達成率（累計） （④÷②）		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110%	110%	111%	110%	106%	104%	102%											

発生推計量
（別管理建物を除く）

（単位：千トン）

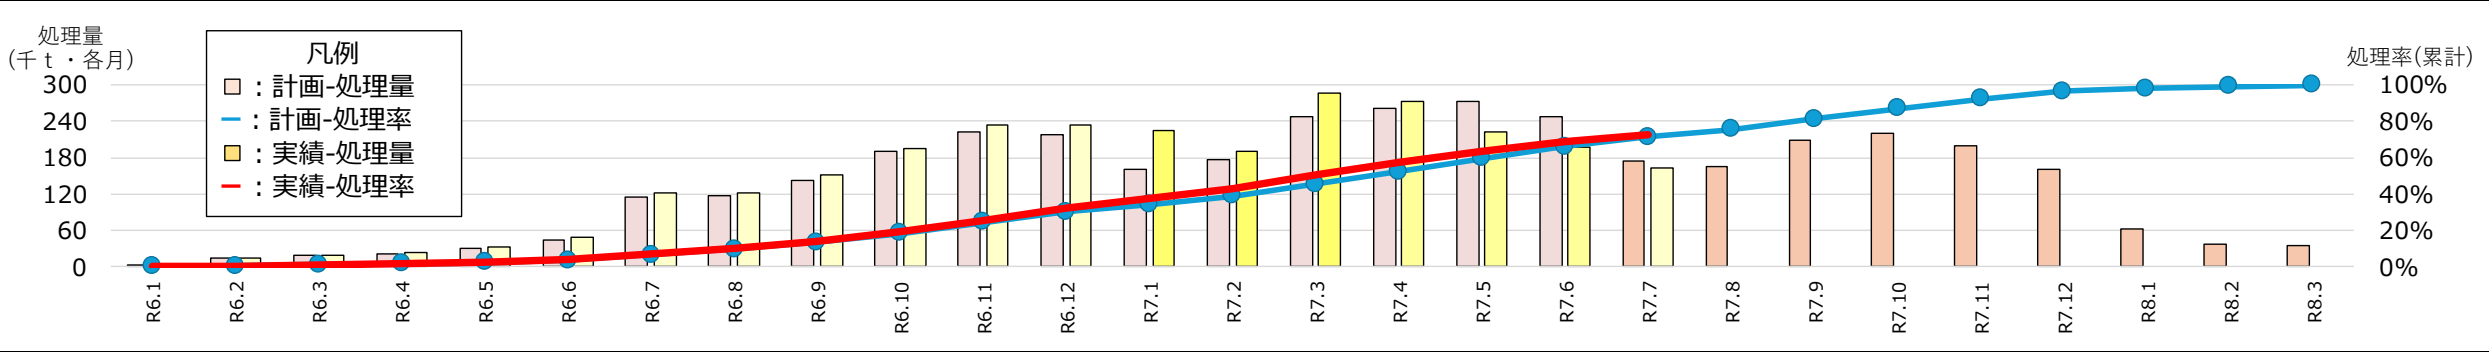

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計
※発生推計量は、加速化プラン【R7.7】の量。別管理建物分の解体ごみ発生推計量は、最新値

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年7月末・暫定値）

（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	別管理建物分 C	処理率 B÷(A-C)
珠州市	831	659 (100%)	66 (10.0%)	97 (14.8%)	295 (44.8%)	11 (1.6%)	190 (28.8%)	0 (0.0%)	16	80.9%
輪島市	1,276	868 (100%)	72 (8.3%)	135 (15.5%)	374 (43.1%)	20 (2.3%)	267 (30.7%)	0 (0.0%)	110	74.5%
能登町	348	237 (100%)	14 (6.1%)	53 (22.4%)	78 (33.1%)	5 (2.0%)	86 (36.4%)	0 (0.0%)	38	76.4%
穴水町	259	232 (100%)	21 (8.8%)	34 (14.5%)	119 (51.2%)	5 (2.0%)	55 (23.5%)	0 (0.0%)	6	92.0%
七尾市	800	285 (100%)	26 (9.0%)	52 (18.1%)	103 (36.0%)	7 (2.3%)	99 (34.6%)	0 (0.0%)	203	47.8%
志賀町	365	214 (100%)	9 (4.3%)	51 (23.6%)	92 (43.2%)	3 (1.5%)	58 (27.3%)	0 (0.0%)	40	65.7%
上記以外の市 町	316	190 (100%)	9 (4.8%)	34 (17.9%)	55 (28.7%)	4 (1.9%)	89 (46.6%)	0 (0.1%)	11	62.4%
合 計	4,195	2,686 (100%)	217 (8.1%)	455 (16.9%)	1,116 (41.6%)	54 (2.0%)	843 (31.4%)	1 (0.0%)	424	71.2%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など
