

令和7年3月7日(金)
生活環境部資源循環推進課
担当者 川畑 俊之
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体加速化プランの進捗状況について

公費解体加速化プランに基づき、公費解体の進捗状況及び災害廃棄物の処理状況について、別紙のとおり公表します。なお、同様の内容を県ホームページでも掲載します。

公費解体の進捗状況（令和7年2月末）




- 解体見込棟数39,235棟の **48.3%**となる **18,944棟**の解体が完了
- 2月単月 計画: 1,958棟 実績: 1,832棟 達成率: 94%
- 2月末累計 計画:18,560棟 実績:18,944棟 達成率:102%

大雪の影響により、2月単月の解体棟数は計画を下回ったものの、1月末累計が計画を510棟上回っていたため、2月末累計は計画を上回った。

加速化プラン【R6.8】

加速化プラン【R7.1改定】

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数	8	56	120	247	601	661	982	1,120	1,211	1,256	973	1,021	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	800	482
	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,749	3,099	3,098	3,005	3,095	2,380	2,005	1,244
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,309	24,408	27,506	30,511	33,606	35,986	37,991	39,235
	解体実施率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832								
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944								
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%								
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%								
計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%									

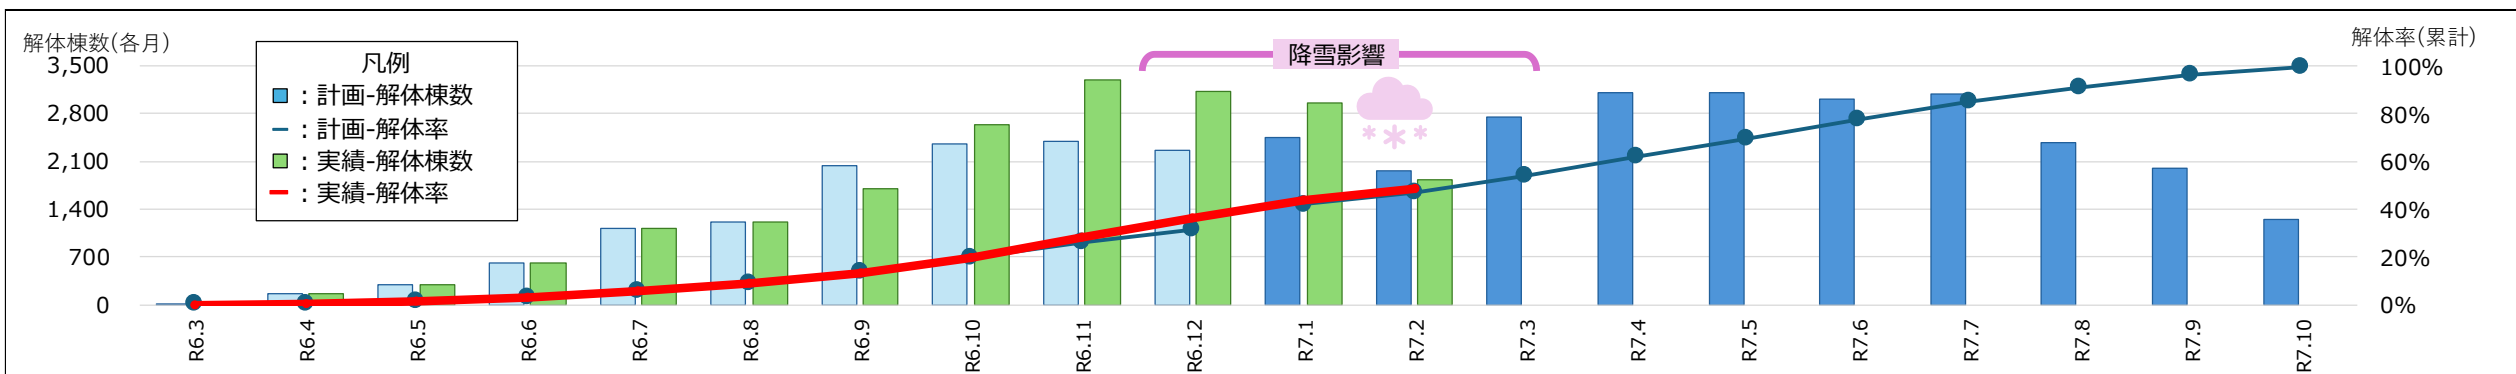

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の状況（令和7年2月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.1〕A	申請棟数	完了棟数 B	完了棟数			解体率 B÷A
				公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	8,023 〔43〕	7,643 〔31〕	4,951 〔0〕	4,803 〔0〕	111 〔0〕	37 〔0〕	61.7% 〔0.0%〕
輪島市	11,267 〔276〕	11,050 〔99〕	5,137 〔0〕	4,872 〔0〕	229 〔0〕	36 〔0〕	45.6% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	3,552 〔8〕	1,739 〔0〕	1,696 〔0〕	2 〔0〕	41 〔0〕	44.0% 〔0.0%〕
穴水町	2,703	2,744	1,749	1,718	0	31	64.7%
七尾市	5,900	4,952	1,906	1,569	0	337	32.3%
志賀町	4,233	4,120	1,947	1,705	9	233	46.0%
その他	3,158	3,127	1,515	1,172	4	339	48.0%
計	39,235 〔335〕	37,188 〔138〕	18,944 〔0〕	17,535 〔0〕	355 〔0〕	1,054 〔0〕	48.3% 〔0.0%〕

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

災害廃棄物の処理状況（令和7年1月末・暫定値）




- 発生推計量410万トンの **34.3%**となる **141万トン**の処理が完了
- 1月単月 計画: 16万トン 実績: 22万トン 達成率:139%
- 1月末累計 計画:129万トン 実績:141万トン 達成率:109%

1月は降雪が少なかったため、仮置場からの搬出が円滑に進んだことで計画を上回った。

(単位：千トン)

		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
処分計画※	解体ごみの推計発生量（各月）			2	17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	283	327	251	212	132					
	①処理量（各月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	273	261	261	273	259	221	29	14	8
	② "（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,773	3,034	3,294	3,567	3,826	4,047	4,076	4,090	4,098
	処理率（累計）	0.07%	0.40%	0.86%	1.4%	2.1%	3.1%	6.0%	8.8%	12%	17%	22%	28%	32%	36%	42%	48%	55%	61%	68%	74%	80%	87%	93%	99%	99%	99%	100%
処分実績	③処理実績（各月）	4	14	19	22	29	44	118	120	149	197	236	233	222														
	④ "（累計）	4	18	37	58	88	132	250	369	519	716	952	1,185	1,407														
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.43%	0.89%	1.4%	2.1%	3.2%	6.1%	9.0%	12.7%	17.5%	23.2%	28.9%	34.3%														
	計画達成率（各月） （③÷①）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139%														
計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109%															

※ 加速化プラン【R7.1改定】

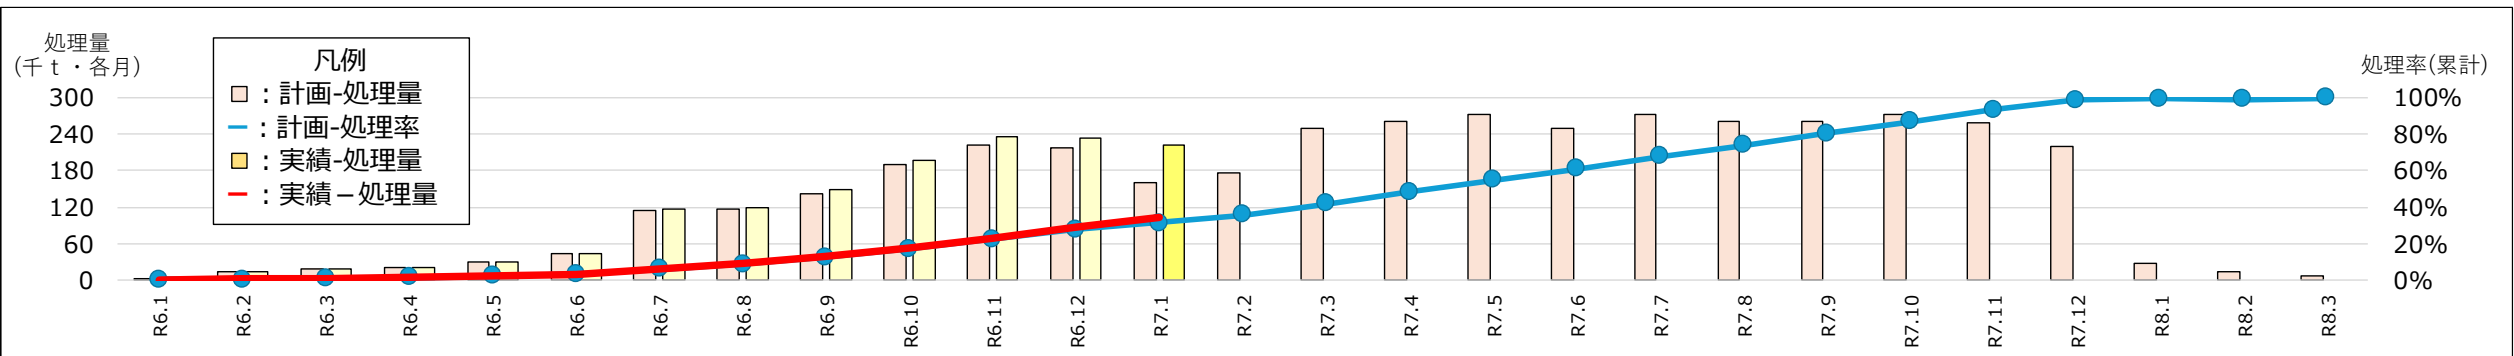

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

※処分実績は、最新の集計値を使用

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年1月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	処理内容						処理率 B ÷ A
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	
珠州市	858	385 (100%)	46 (12.1%)	42 (10.9%)	165 (42.9%)	6 (1.5%)	125 (32.6%)	0 (0.0%)	44.9%
輪島市	1,132	402 (100%)	38 (9.5%)	49 (12.3%)	165 (41.0%)	10 (2.6%)	140 (34.7%)	0 (0.0%)	35.6%
能登町	411	128 (100%)	11 (8.2%)	26 (20.3%)	42 (32.6%)	3 (2.5%)	47 (36.3%)	0 (0.0%)	31.1%
穴水町	278	139 (100%)	17 (12.1%)	15 (11.1%)	74 (52.9%)	3 (1.9%)	31 (22.0%)	0 (0.0%)	50.0%
七尾市	632	145 (100%)	16 (10.8%)	23 (15.9%)	54 (37.2%)	3 (2.2%)	49 (33.9%)	0 (0.0%)	23.0%
志賀町	502	115 (100%)	6 (5.0%)	24 (20.6%)	56 (48.5%)	2 (1.7%)	28 (24.1%)	0 (0.0%)	22.8%
上記以外の市 町	283.7	92.7 (100%)	4.6 (5.0%)	16.5 (17.8%)	27.1 (29.2%)	2.1 (2.2%)	42.5 (45.8%)	0.1 (0.1%)	32.7%
合 計	4,098	1,407 (100%)	138 (9.8%)	196 (13.9%)	582 (41.4%)	29 (2.1%)	461 (32.8%)	0 (0.0%)	34.3%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

（ ）内は、種類ごとの割合、「その他」は、蛍光灯など
