

令和6年10月7日(月)
生活環境部資源循環推進課
担当者 川畑 俊之
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体の進捗状況（令和6年9月末）について

令和6年9月末の公費解体の進捗状況について、8月26日に公表した公費解体加速化プランに基づき、別紙のとおり公表します。
同様の内容を県ホームページでも掲載します。

公費解体の進捗状況（令和6年9月末）




- ▶ 解体見込み棟数32,410棟の **約16%**である **5,096棟**の解体が完了
- ▶ 9月末までの解体計画 5,432棟に対し、達成率は **94%**であった。
- ▶ 9月の解体棟数は、8月よりも約500棟増加したが、令和6年奥能登豪雨の影響により、9月の計画より336棟下回った。

R6.10.1時点の
解体班数 998班

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数※	8	56	120	291	601	650	950	1,060	1,120	1,120	1,120	1,120	1,080	1,080	1,080	1,080	1,000	1,000	750	486
	①解体棟数（各月）※	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	1,969	1,841	2,315	2,392	2,392	2,315	2,213	1,859	1,593	1,076
	② "（累計）※	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	14,414	16,255	18,570	20,962	23,354	25,669	27,882	29,741	31,334	32,410
	解体率（累計）※	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	16.8%	24.0%	31.4%	38.4%	44.5%	50.2%	57.3%	64.7%	72.1%	79.2%	86.0%	91.8%	96.7%	100%
解体実績	③解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700													
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096													
	解体率（計画棟数あたり）	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	15.7%													
	計画達成率（各月） （③÷①）	—	—	—	—	—	100%	83%													
	計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	94%													

※R6.3～R6.7は実績を記載。自費解体・緊急解体の棟数を含む

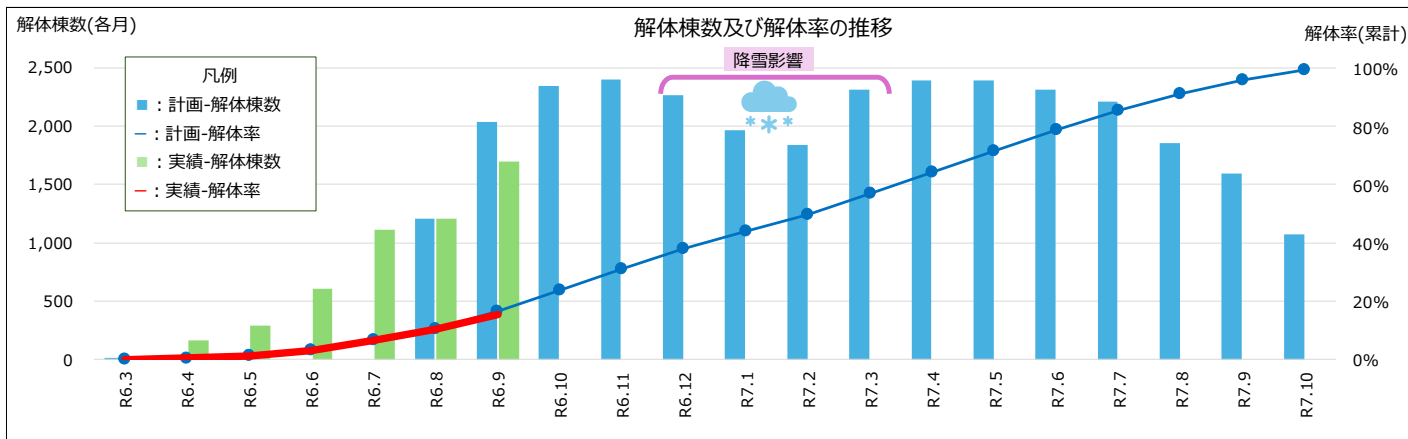

令和6年奥能登豪雨による影響

- ▶ 奥能登全域で **一時的に解体を中断**
（一部地域では現在も中断中）
- ▶ 道路状況の悪化により、解体速度が低下

市町別の公費解体の状況（令和6年9月末）



市町	解体見込棟数※ (R6.8) A	申請棟数※	着手棟数※	完了棟数 B	完了棟数 B			解体率 B÷A
					公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	7,195	6,322	3,046	1,681	1,567	106	8	23.4%
輪島市	9,685	9,256	4,289	874	638	217	19	9.0%
能登町	2,759	2,643	1,259	471	460	2	9	17.1%
穴水町	2,451	2,454	1,158	621	611	0	10	25.3%
七尾市	3,500	3,561	1,680	421	253	0	168	12.0%
志賀町	4,012	3,438	1,875	472	306	9	157	11.8%
その他	2,808	2,366	1,205	556	338	4	214	19.8%
合 計	32,410	30,040	14,512	5,096	4,173	338	585	15.7%

解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。

ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。

※ 緊急解体・自費解体を含む
