

令和6年11月6日(水)
生活環境部資源循環推進課
担当者 川畑 俊之
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体の進捗状況（令和6年10月末）について

令和6年10月末の公費解体の進捗状況について、8月26日に公表した公費解体加速化プランに基づき、別紙のとおり公表します。同様の内容を県ホームページでも掲載します。


公費解体の進捗状況（令和6年10月末）



- ▶ 解体見込棟数32,410棟の **23.9%**である **7,734棟**の解体が完了
- ▶ 10月単月 計画:2,348棟 実績:2,638棟 達成率:**112%**
 （奥能登豪雨の影響を受けた解体班の増強や配置変更、面的解体などにより、9月（1,700棟）よりも約900棟増加）
- ▶ 10月末累計 計画:7,780棟 実績:7,734棟 達成率:**99.4%**
 （解体困難な地域を除き、奥能登豪雨の影響による解体の遅れを概ね解消 9月末:93.8% → 10月末:99.4%）

	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画																				
解体班数	8	56	120	291	601	650	950	1,060	1,120	1,120	1,120	1,120	1,080	1,080	1,080	1,080	1,000	1,000	750	486
①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	1,969	1,841	2,315	2,392	2,392	2,315	2,213	1,859	1,593	1,076
② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	14,414	16,255	18,570	20,962	23,354	25,669	27,882	29,741	31,334	32,410
解体率（累計）	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	16.8%	24.0%	31.4%	38.4%	44.5%	50.2%	57.3%	64.7%	72.1%	79.2%	86.0%	91.8%	96.7%	100%
解体実績																				
③解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638												
④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734												
解体率（計画棟数あたり）	0.0%	0.5%	1.4%	3.3%	6.8%	10.5%	15.7%	23.9%												
計画達成率（各月） （③÷①）	—	—	—	—	—	—	100%	83.5%	112%											
計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	93.8%	99.4%												

ピークトップである解体班数
1,120班に到達(R6.10.29)

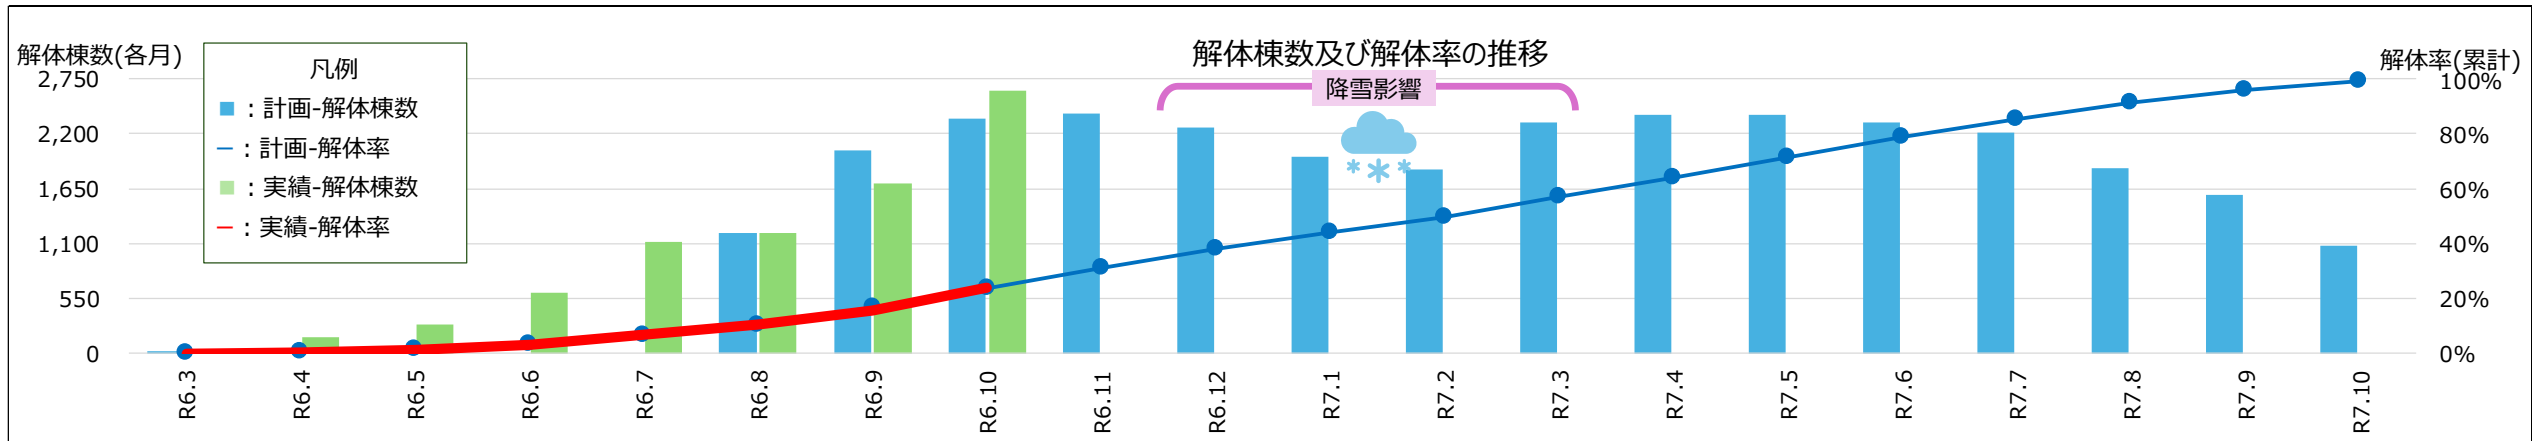

市町別の公費解体の状況（令和6年10月末）



市町	解体見込棟数※ (R6.8) A	申請棟数※	着手棟数※	完了棟数 B	完了棟数 B			解体率 B÷A
					公費解体	緊急解体	自費解体	
珠州市	7,195	6,737	4,105	2,551	2,433	109	9	35.5%
輪島市	9,685	9,755	5,461	1,357	1,115	222	20	14.0%
能登町	2,759	2,851	1,702	721	710	2	9	26.1%
穴水町	2,451	2,504	1,377	868	857	0	11	35.4%
七尾市	3,500	3,890	2,625	678	475	0	203	19.4%
志賀町	4,012	3,611	2,371	792	595	9	188	19.7%
その他	2,808	2,517	1,490	767	517	4	246	27.3%
合 計	32,410	31,865	19,131	7,734	6,702	346	686	23.9%

解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。

ただし、珠州市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。

※ 緊急解体・自費解体を含む
