

令和7年5月8日(木)
生活環境部資源循環推進課
担当者 岡 秀雄
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体加速化プランの進捗状況について


公費解体加速化プランに基づき、公費解体の進捗状況及び災害廃棄物の処理状況について、別紙のとおり公表します。なお、同様の内容を県ホームページでも掲載します。



公費解体の進捗状況（令和7年4月末）

- 解体見込棟数39,235棟の **66.3%**となる **26,031棟**の解体が完了
 - 4月単月 計画: 3,096棟 実績: 3,546棟 達成率:115%
 - 4月末累計 計画:24,403棟 実績:26,031棟 達成率:107%
- 4月における解体棟数は、計画を上回った

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1改定】									
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数	8	56	120	247	601	661	982	1,120	1,211	1,256	973	1,021	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	800	482
	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245
	② “ （累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235
	解体実施率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546						
	④ “ （累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031						
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%	57.3%	66.3%						
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%						
	計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%						

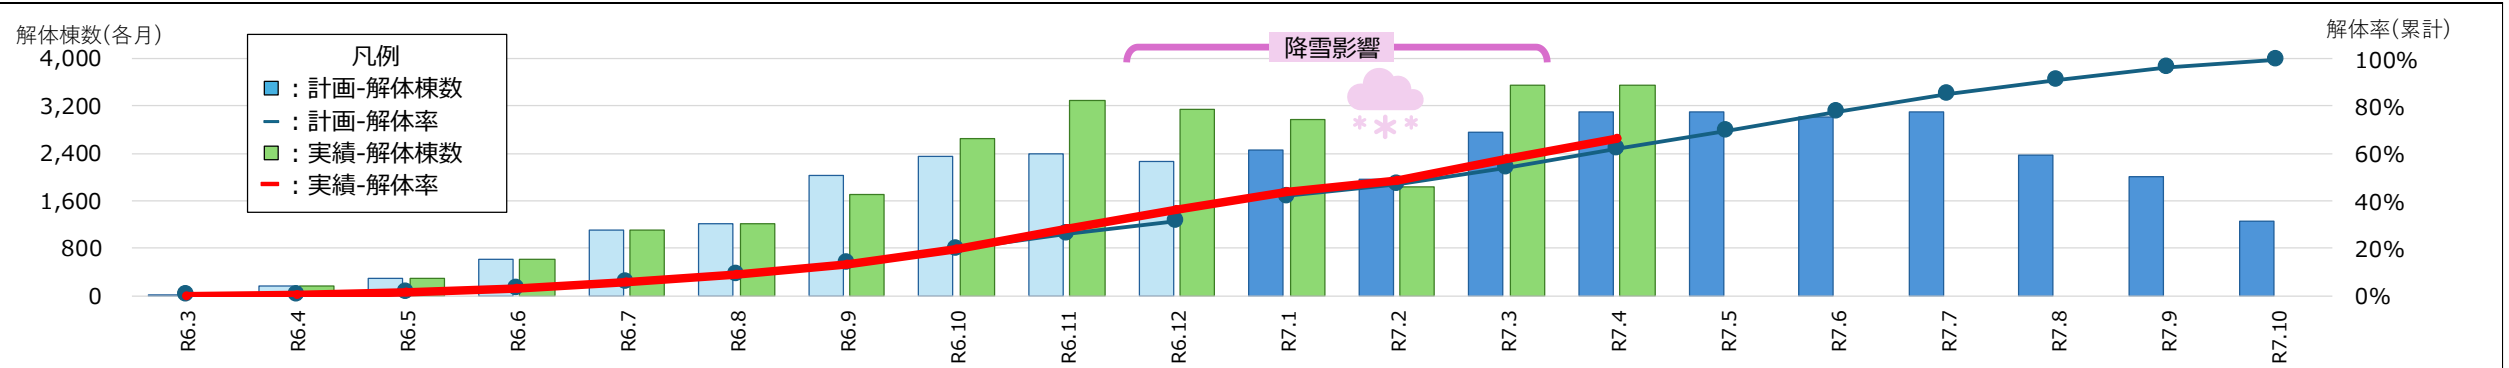

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の状況（令和 7 年 4 月末）



市町	解体見込棟数 【R7.1】A	申請棟数 B	完了棟数 C				見込棟数あたり 解体率 C ÷ A	申請棟数あたり 解体率 C ÷ B
				公費解体	緊急解体	自費解体		
珠州市	8,023 〔43〕	7,873 〔44〕	5,955 〔2〕	5,806 〔2〕	111 〔0〕	38 〔0〕	74.2% 〔4.7%〕	75.6% 〔4.5%〕
輪島市	11,267 〔276〕	11,699 〔167〕	7,713 〔0〕	7,446 〔0〕	229 〔0〕	38 〔0〕	68.5% 〔0.0%〕	65.9% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	4,014 〔14〕	2,415 〔3〕	2,363 〔3〕	2 〔0〕	50 〔0〕	61.1% 〔18.8%〕	60.2% 〔21.4%〕
穴水町	2,703	2,765	2,176	2,145	0	31	80.5%	78.7%
七尾市	5,900	5,517	2,840	2,451	0	389	48.1%	51.5%
志賀町	4,233	4,436	2,910	2,621	9	280	68.7%	65.6%
上記以外の市町	3,158	3,725	2,022	1,622	4	396	64.0%	54.3%
計	39,235 〔335〕	40,029 〔225〕	26,031 〔5〕	24,454 〔5〕	355 〔0〕	1,222 〔0〕	66.3% 〔1.5%〕	65.0% 〔2.2%〕

※令和 6 年能登半島地震及び令和 6 年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和 6 年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

災害廃棄物の処理状況（令和7年3月末・暫定値）




- 発生推計量410万トンの **44.6%**となる **183万トン**の処理が完了
- 3月単月 計画：25万トン 実績：23万トン 達成率：93%
- 3月末累計 計画:172万トン 実績:183万トン 達成率:106%

3月単月では、民間のコンクリートがら処理施設での受入抑制により、仮置場からの搬出が滞り、計画を下回った。累計では、計画を上回った。

(単位：千トン)

		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
処分計画※	解体ごみの推計発生量（各月）			2	17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	327	251	212	132					
	①処理量（各月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	273	261	261	273	259	221	29	14	8
	②　　"　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,773	3,034	3,294	3,567	3,826	4,047	4,076	4,090	4,098
	処理率（累計）	0.07%	0.40%	0.86%	1.4%	2.1%	3.1%	6.0%	8.8%	12%	17%	22%	28%	32%	36%	42%	48%	55%	61%	68%	74%	80%	87%	93%	99%	99%	99%	100%
処分実績	③処理実績（各月）	4	14	19	22	29	44	118	120	149	197	236	234	223	186	232												
	④　　"　　（累計）	4	18	37	58	88	131	249	369	519	716	952	1,186	1,408	1,594	1,826												
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.43%	0.89%	1.4%	2.1%	3.2%	6.1%	9.0%	12.7%	17.5%	23.2%	28.9%	34.4%	38.9%	44.6%												
	計画達成率（各月） （③÷①）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139%	105%	93%												
	計画達成率（累計） （④÷②）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109%	108%	106%												

※ 加速化プラン【R7.1改定】

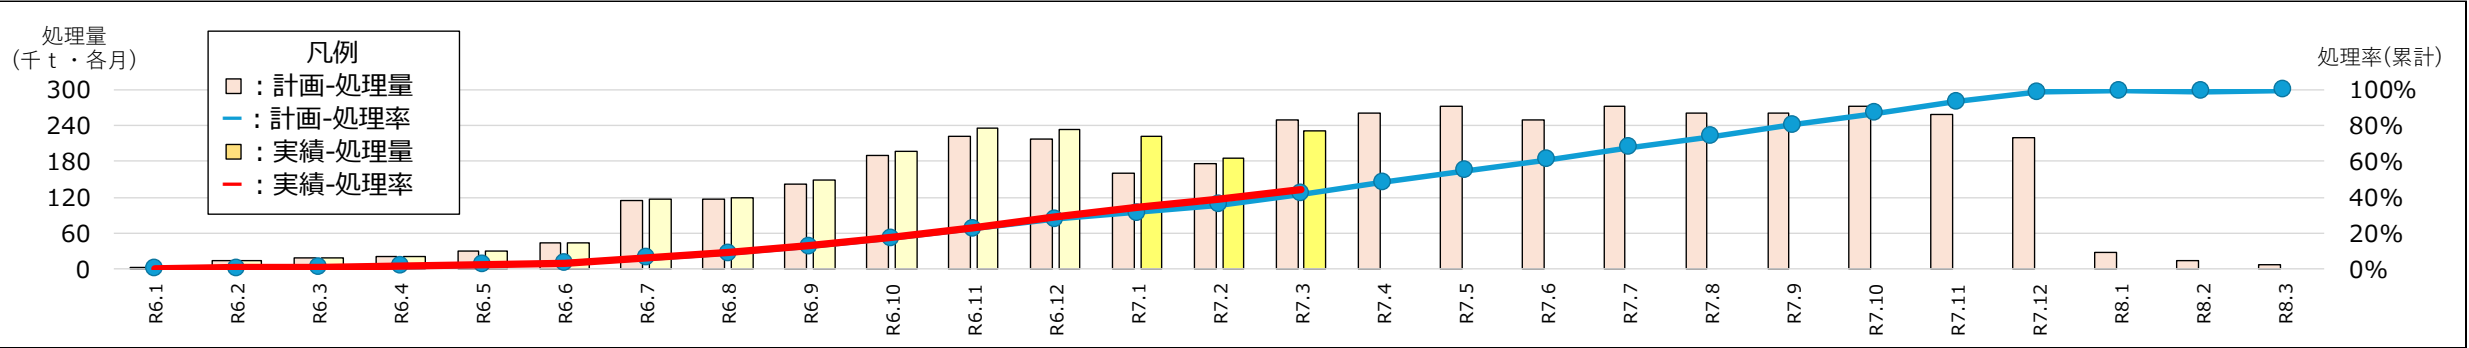

※ 令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計 ※ 処分実績は、最新の集計値を使用

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年3月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	処理率 B ÷ A
珠洲市	858	474 (100%)	54 (11.3%)	59 (12.4%)	209 (44.0%)	8 (1.6%)	145 (30.6%)	0 (0.0%)	55.2%
輪島市	1,132	550 (100%)	53 (9.6%)	72 (13.2%)	231 (42.1%)	14 (2.5%)	180 (32.7%)	0 (0.0%)	48.6%
能登町	411	165 (100%)	12 (7.2%)	36 (21.9%)	54 (32.6%)	4 (2.2%)	60 (36.1%)	0 (0.0%)	40.1%
穴水町	278	172 (100%)	18 (10.6%)	23 (13.6%)	90 (52.2%)	3 (1.9%)	37 (21.6%)	0 (0.0%)	61.8%
七尾市	632	193 (100%)	20 (10.2%)	36 (18.6%)	70 (36.4%)	4 (2.1%)	63 (32.8%)	0 (0.0%)	30.6%
志賀町	502	150 (100%)	7 (4.6%)	33 (21.6%)	71 (47.2%)	2 (1.5%)	38 (25.0%)	0 (0.0%)	29.9%
上記以外の市 町	283.7	121.7 (100%)	6.1 (5.0%)	22.0 (18.1%)	35.0 (28.7%)	2.4 (2.0%)	56.1 (46.1%)	0.1 (0.1%)	42.9%
合 計	4,098	1,826 (100%)	169 (9.3%)	281 (15.4%)	760 (41.6%)	37 (2.0%)	579 (31.7%)	0 (0.0%)	44.6%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない、（ ）内は、種類ごとの割合、「その他」は、蛍光灯など
