

## 農山漁村地域整備計画における事後評価


整備計画名	元気いっぱい石川の漁業漁村づくり計画	
計画策定主体	対象市町村	計画期間
石川県	七尾市、輪島市、珠洲市、 志賀町【4市町】	平成 22 年度～平成 26 年度 (5 ヶ年)

### 1 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施 主体	工 期	主な事業内容等
地域水産物供給基盤 整備事業	鹿磯	石川県	H22～H24	護岸 L=70m 防波堤 L=22.1m
漁村再生交付金事業	寺家	珠洲市	H23～H26	防波堤 L=31m
漁村再生交付金事業	安部屋	志賀町	H24～H26	防波堤 L=70m
漁村再生交付金事業	鵜浦	七尾市	H24～H25	防波堤 L=50m
進捗状況	護岸 L=221.0m 防波堤 L= 22.1m (進捗率 100%)			

### 2 事業効果の発現状況

事業の実施により、越波を軽減することができたことで、漁港内用地や水域が防護され、漁業者の安全性が向上した。

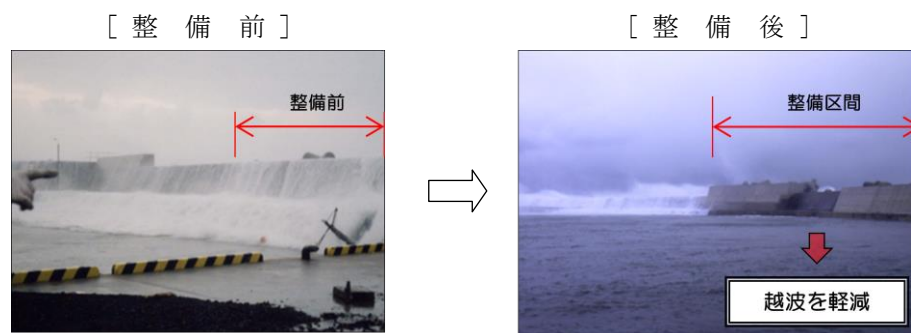


『鹿磯漁港における事業効果』

また、事業に対する客観的な評価として、鹿磯漁港の整備について、漁業利用者を対象にアンケート調査を行った。その結果、約7割の漁業利用者の方から、漁港整備の実施は、地域として良かったという回答が得られた。また、約6割の方から、港内の波が静かになり作業が良くなった及び漁村の損傷が軽減されたとの良い回答が得られた。

他にも、漁業に係る作業時間が減少した、外来船がよく係留する場所であり、安全な漁港になったことで、より入港してくれ地元漁港が潤う等の回答が得られた。

アンケート調査の結果より、漁港施設整備を実施することで、漁業者に安全安心な使用を確保することができ、また安全使用をすることで漁船の耐用年数延長に一定の効果があったと考える。

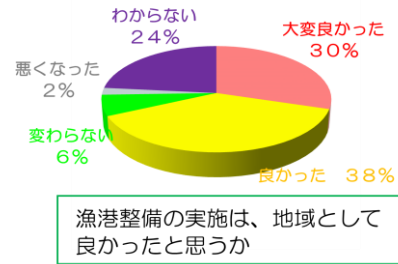

『事業に対するアンケート調査の結果』

### 3 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率
防護施設延長	243m	243m	100%

### 4 今後の方針

アンケート調査の結果より、漁港整備に対する効果や期待を多く感じる事ができた。今後は、他事業にて引き続き防波堤改良等を実施するとともに、経年劣化等に対する施設の長寿命化計画を策定し、適切な維持管理を行うことにより、防護機能や安全性の確保を図ってまいりたい。
