


狼煙漁港（狼煙地区） 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

※国による代行工事

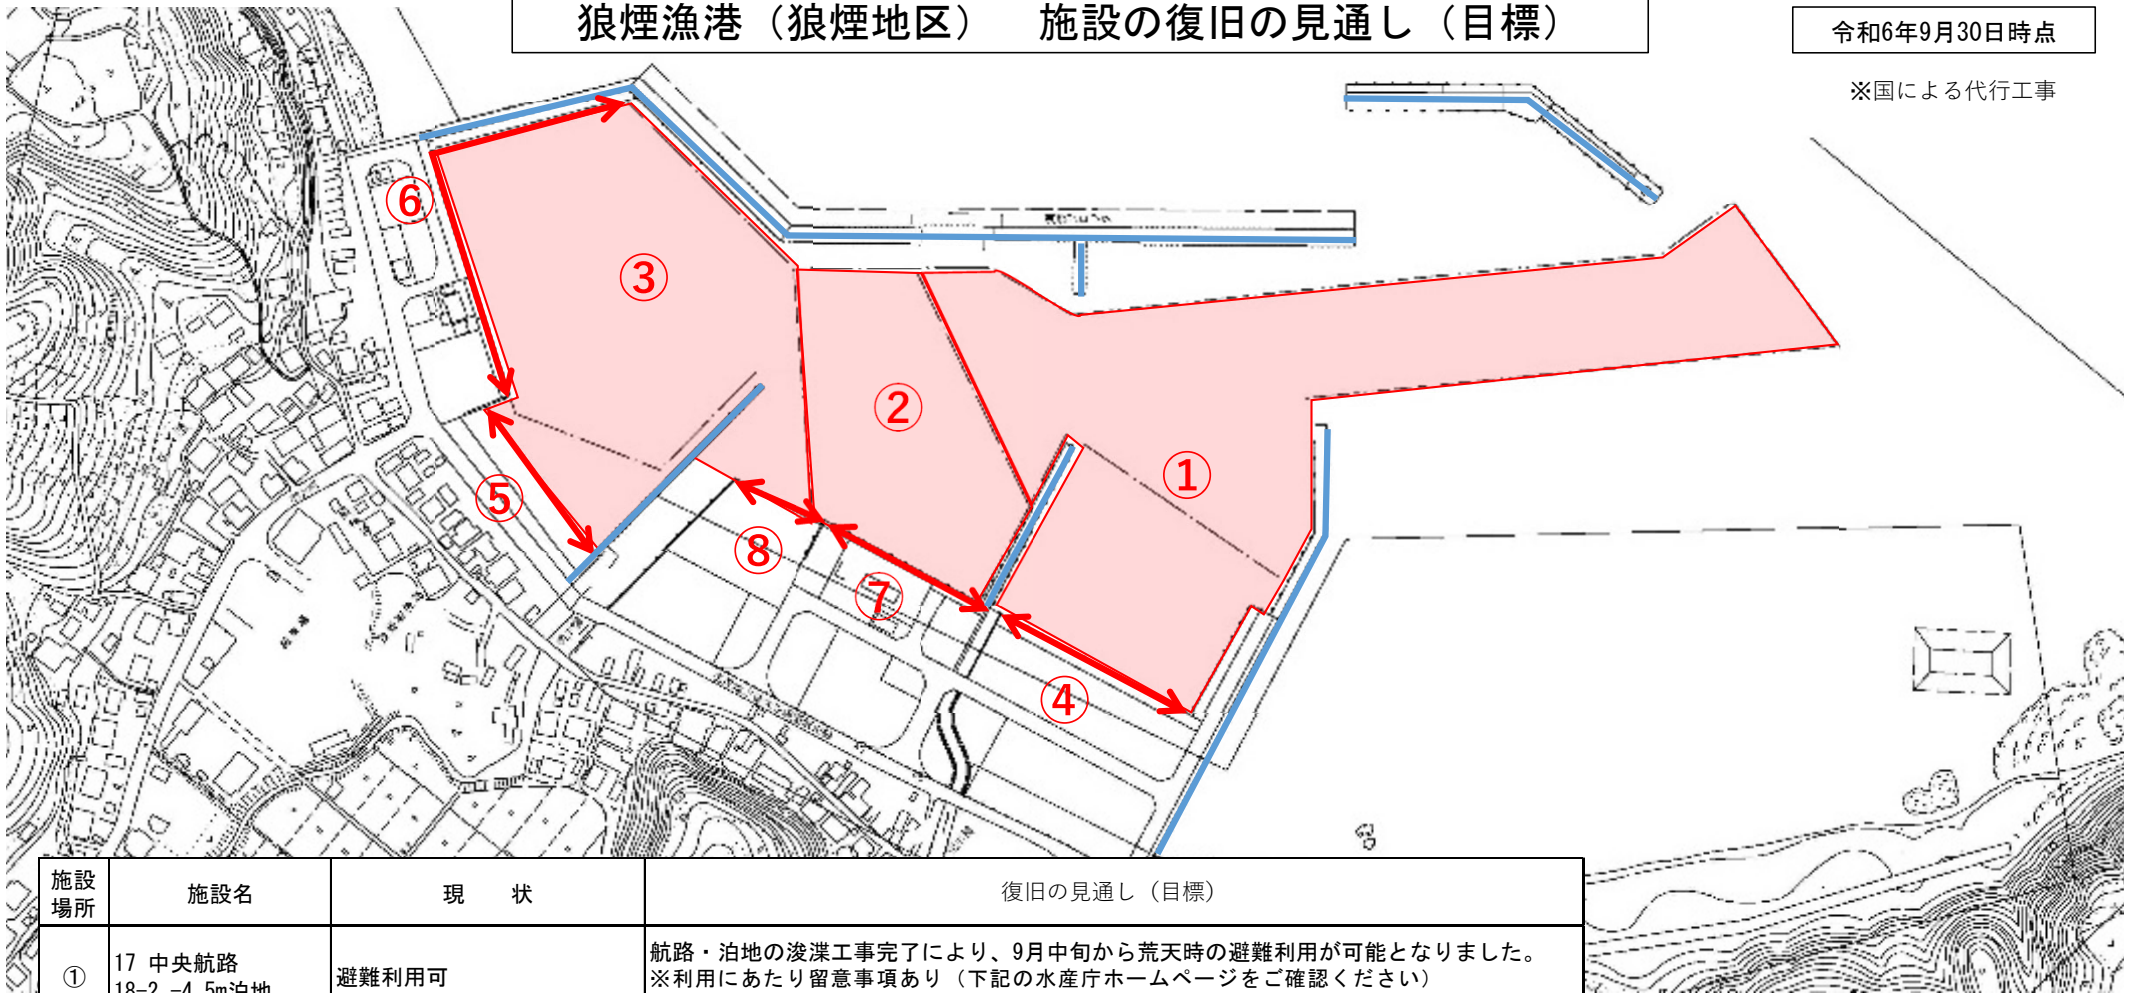


施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	17 中央航路 18-2 -4.5m泊地	避難利用可	航路・泊地の浚渫工事完了により、9月中旬から荒天時の避難利用が可能となりました。 ※利用にあたり留意事項あり（下記の水産庁ホームページをご確認ください） （外部リンク） https://www.ifa.maff.go.jp/j/press/seibi/240911_9.html
②	18-1 -4.5m泊地	一部暫定利用可 （暫定水深-3.0m）	令和7年2月～4月頃 本復旧着手予定 令和7年9月頃 供用可（水深-4.5m）
③	18 -3.0m泊地	利用不可（復旧中）	令和6年10月頃 本復旧着手予定 令和7年3月頃 利用可
④	36 -4.5m岸壁	利用不可	令和7年2月～4月頃 本復旧着手予定 令和7年9月～11月頃 全延長供用
⑤	16 船揚場	一部暫定利用可	令和7年1月～3月頃 本復旧着手予定 令和7年6月～8月頃 全延長供用
⑥	15, 19 -3.0m岸壁	利用不可	令和7年2月～4月頃 本復旧着手予定 令和7年4月～6月頃 一部暫定利用可 令和7年9月～11月頃 全延長供用
⑦	20 -4.5m岸壁	利用不可	令和7年7月～9月頃 本復旧着手予定 令和8年6月～8月頃 全延長供用
⑧	26 船揚場	利用不可	令和7年7月～9月頃 本復旧着手予定 令和8年6月～8月頃 全延長供用

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

狼煙漁港（折戸地区） 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

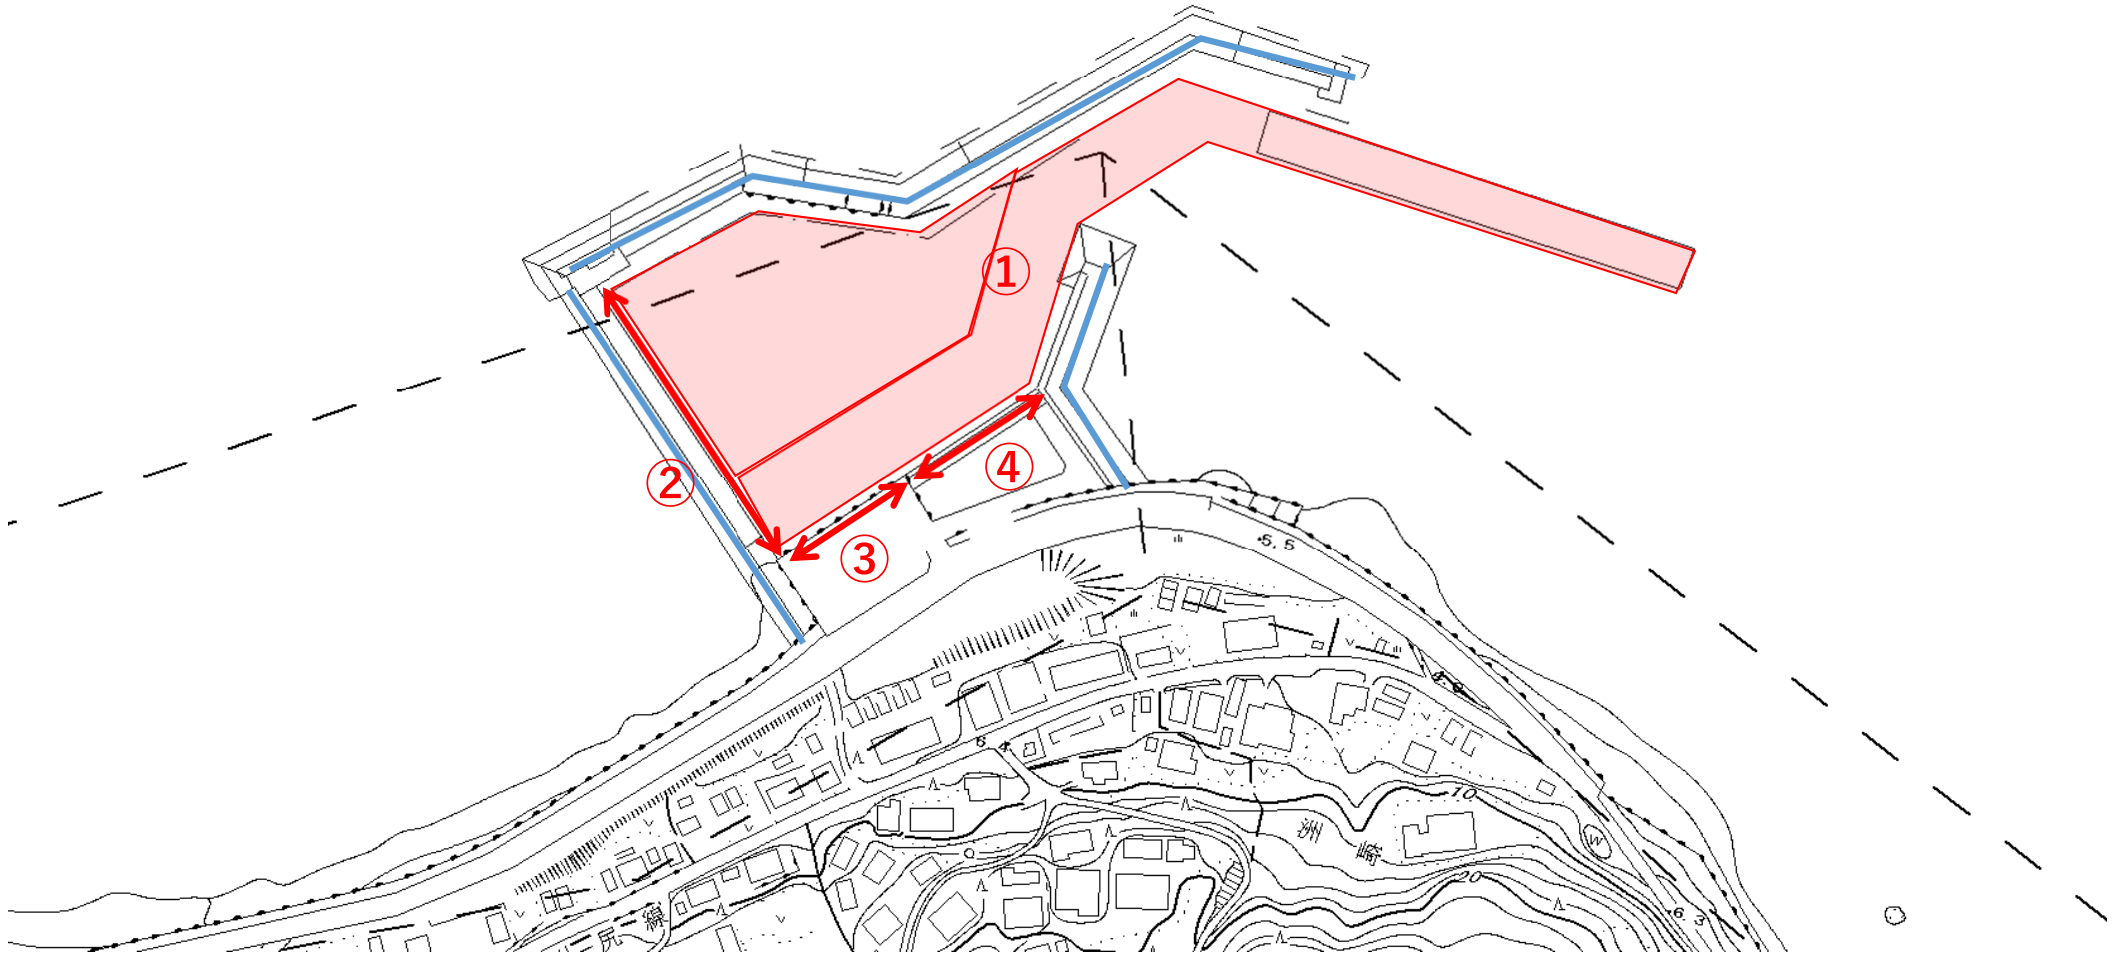


施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	28 中央航路 41 -2.0m泊地	一部暫定利用可	復旧方針検討中
②	22 -2.0m物揚場	利用不可（仮復旧中）	令和6年10月～12月頃より一部暫定利用可 復旧方針検討中
③	14 船揚場	利用不可（仮復旧中）	令和6年10月～12月頃より一部暫定利用可 復旧方針検討中
④	26 -2.0m物揚場	利用不可	復旧方針検討中

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

狼煙漁港（高屋地区） 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

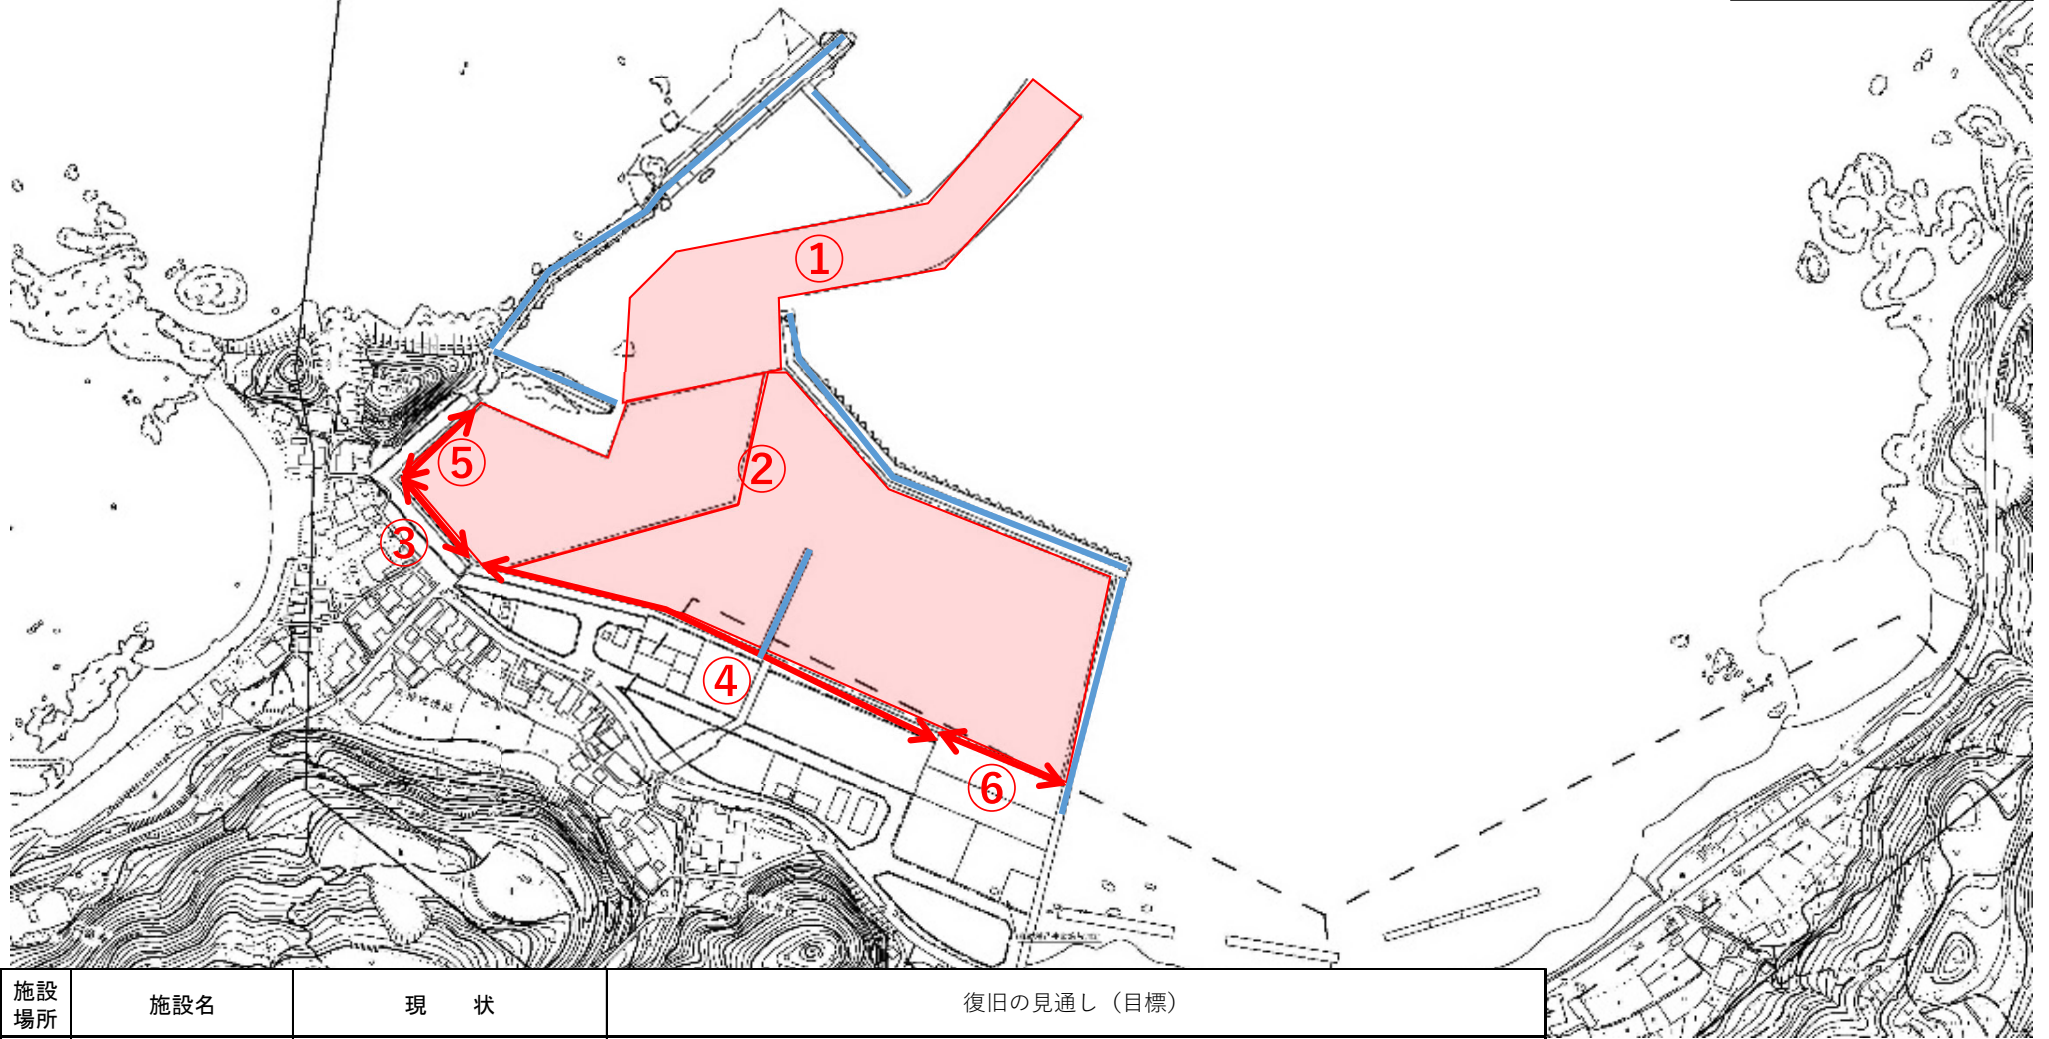


施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	13 中央航路	利用不可（仮復旧中）	令和6年10月～12月頃より一部暫定利用可 復旧方針検討中
②	12 -3.5m泊地 18 -2.5m泊地	利用不可（仮復旧中）	令和6年10月～12月頃より一部暫定利用可 復旧方針検討中
③	10 -3.5m岸壁	利用不可（仮復旧中）	令和6年11月～7年1月頃より一部暫定利用可 復旧方針検討中
④	15 -2.5m物揚場	利用不可（仮復旧中）	令和6年11月～7年1月頃より一部暫定利用可 復旧方針検討中
⑤	9 -3.5m岸壁	利用不可	復旧方針検討中
⑥	16 船揚場	利用不可	復旧方針検討中

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

蛸島漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

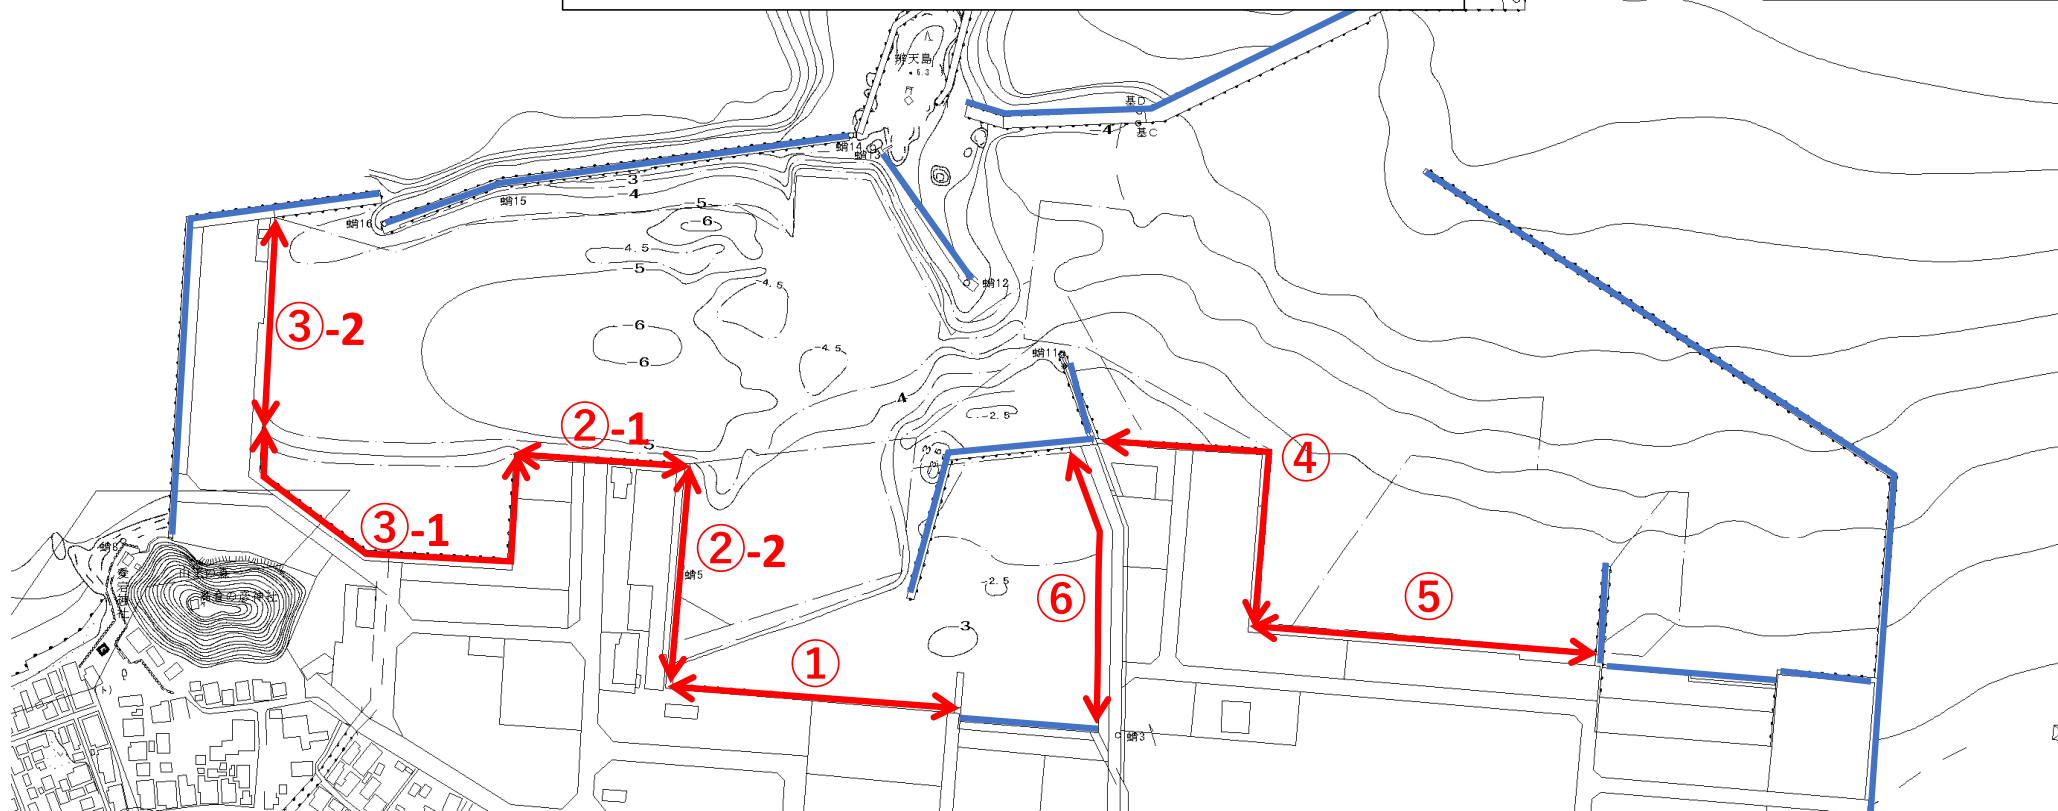


施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	80 E物揚場	暫定利用可	令和8年3月～5月頃 全延長供用
②-1	30 -4.5m岸壁	暫定利用可（仮復旧済）	令和8年12月～令和9年2月頃 全延長供用
②-2	31 -3.5m岸壁 31-1 -4.5m岸壁	暫定利用可	令和7年8月～10月頃 全延長供用
③-1	68 -3.5m岸壁	暫定利用可	復旧方針検討中
③-2	70 -4.5m岸壁	暫定利用可	復旧方針検討中
④	25 護岸 93 -5.5m岸壁	一部暫定利用可	令和8年7月～9月頃 全延長供用
⑤	94 -4.5m岸壁	利用不可	復旧方針検討中
⑥	29 -2.5m物揚場	利用不可	復旧方針検討中

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

高倉漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

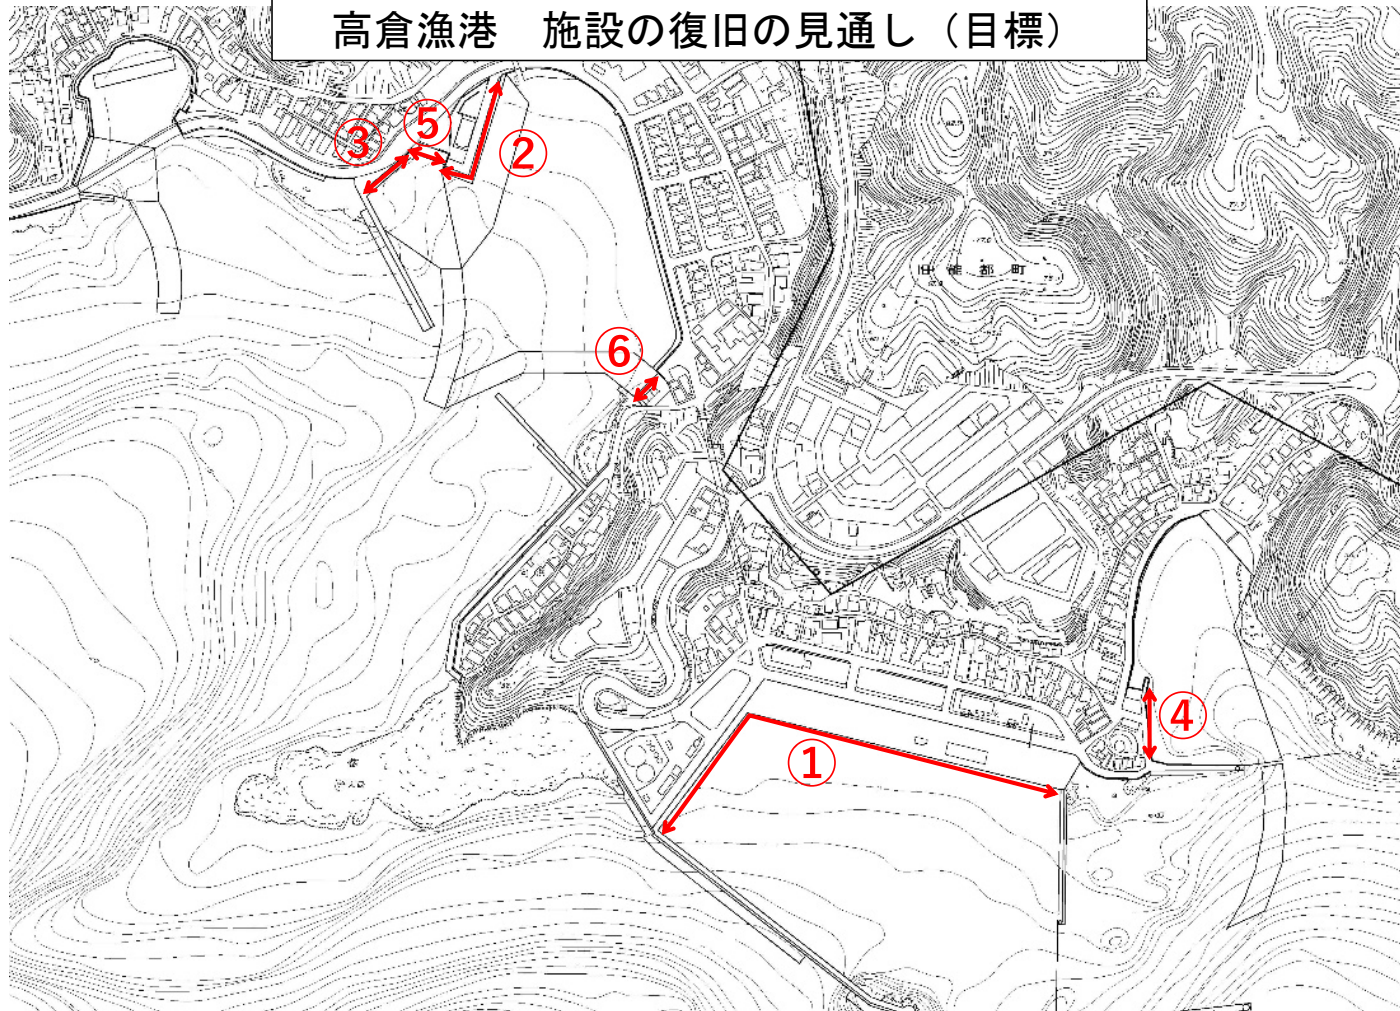


施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	64 -4.5m岸壁	暫定利用可（仮復旧済）	令和7年6月～8月頃（全延長供用）
②	73 -2.0m物揚場	暫定利用可	令和8年2月～4月頃（全延長供用）
③	69 -2.0m物揚場護岸	暫定利用可	令和7年12月～2月頃（全延長供用）
④	20 -2.0m物揚場	暫定利用可	令和8年3月～5月頃（全延長供用）
⑤	70 船揚場	暫定利用可	令和8年9月～11月頃（全延長供用）
⑥	46 船揚場	暫定利用可	令和9年2月～4月頃（全延長供用）

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

鹿磯漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

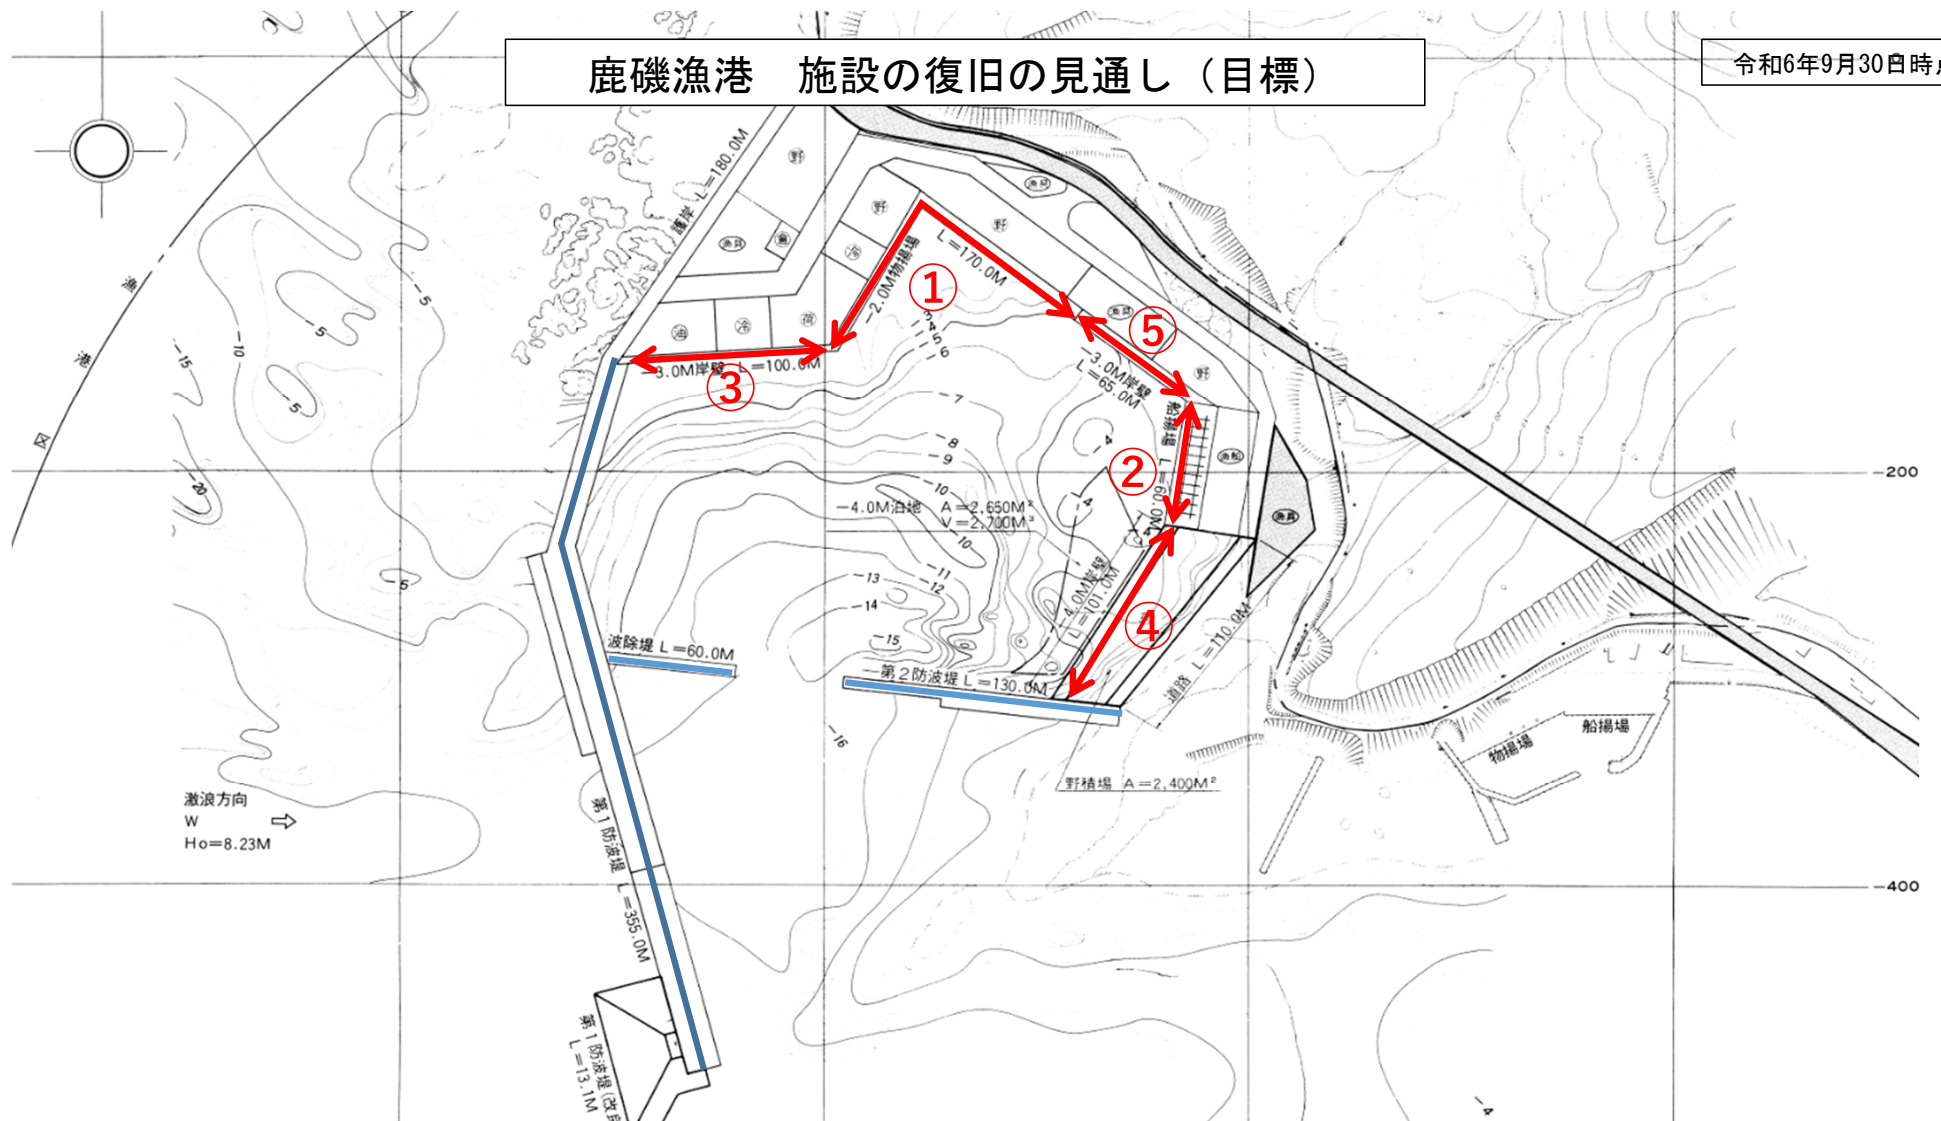


施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	25 -2.0m物揚場	利用不可（仮復旧中）	仮復旧工事により、11月頃から一部暫定利用可（仮設で約40mを供用予定） 復旧方針検討中
②	41 船揚場	利用不可	仮復旧工事により、令和7年3月～5頃から一部暫定利用可（仮設で供用予定） 復旧方針検討中
③	24 -3.0m岸壁	利用不可	復旧方針検討中
④	48 -3.0m岸壁	利用不可	復旧方針検討中
⑤	33 -3.0m岸壁	利用不可	復旧方針検討中

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

富来漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点

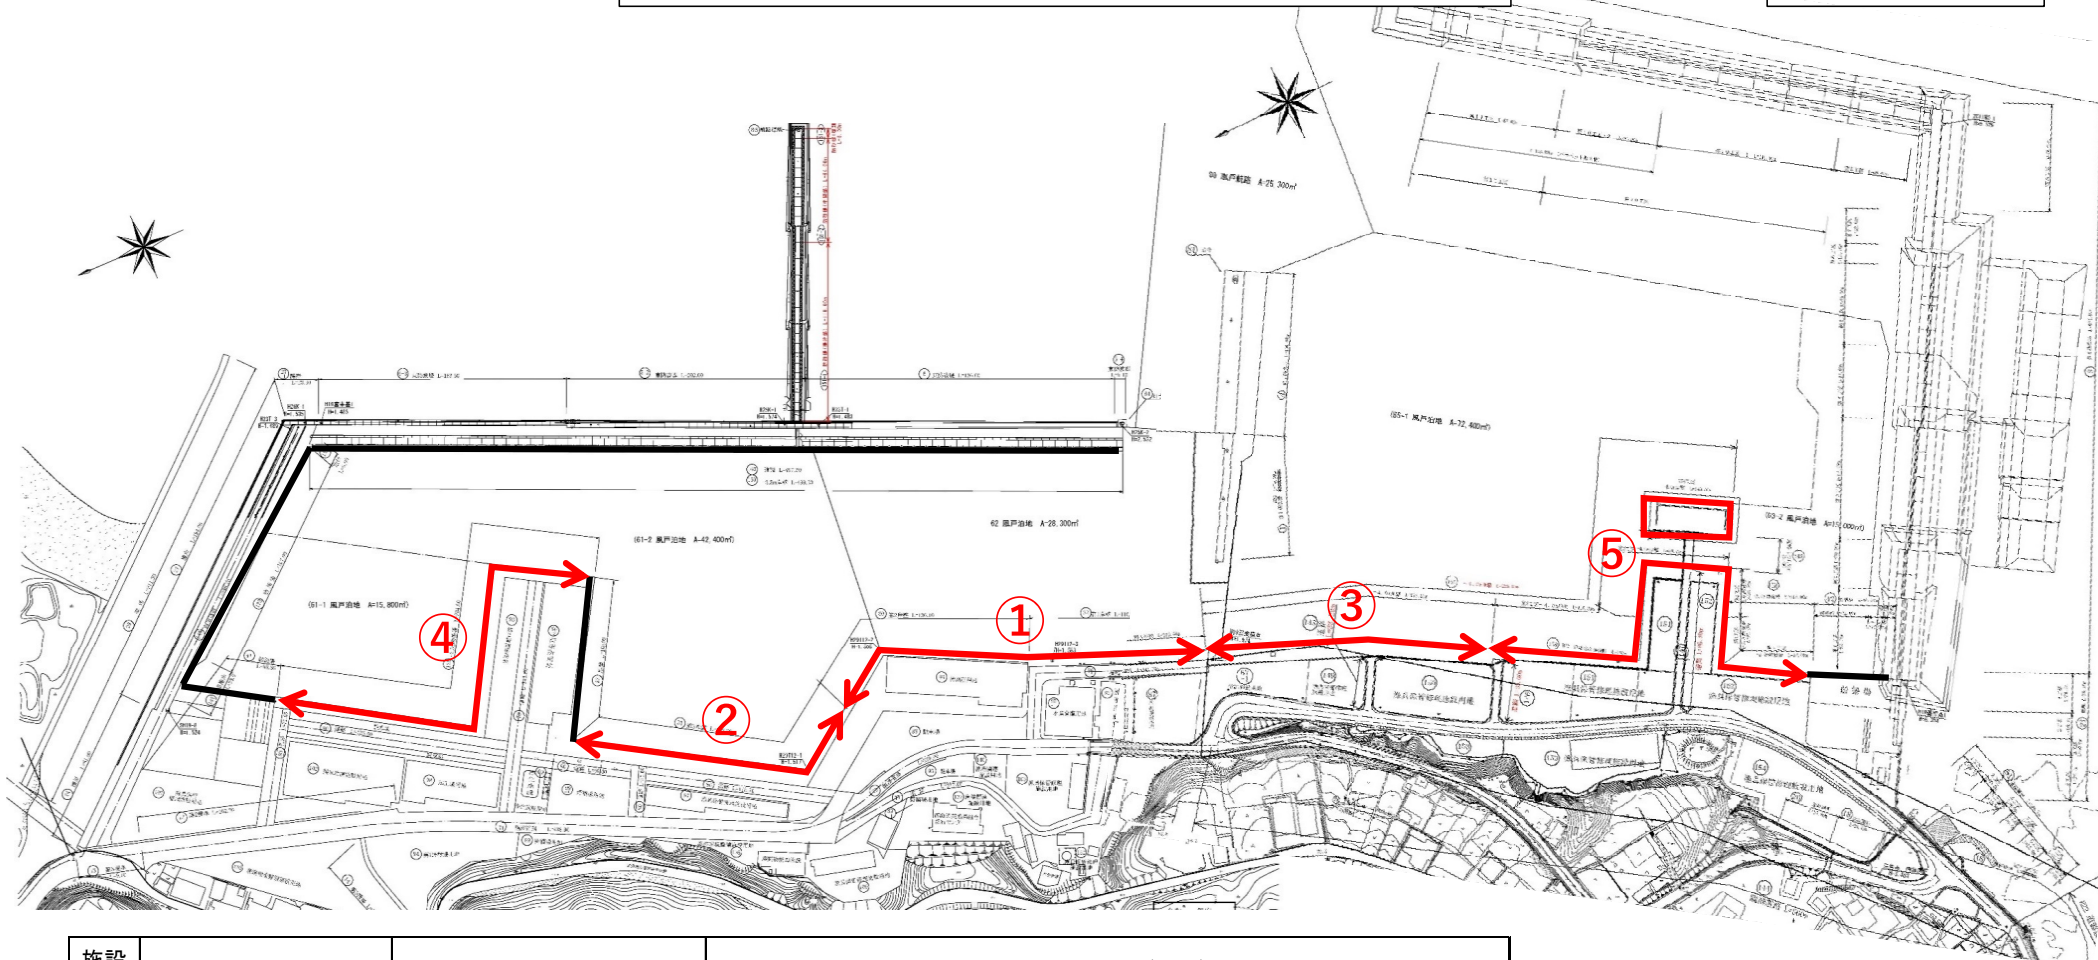

施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	32 第1岸壁 30 第2岸壁	暫定利用可（復旧中）	令和7年1月～3月頃（全延長供用）
②	31 第3岸壁	暫定利用可（復旧中）	令和7年1月～3月頃（全延長供用）
③	141 -4.0m岸壁 （1工区）	暫定利用可（復旧中）	令和7年1月～3月頃（全延長供用）
④	125 -2.5m物揚場	暫定利用可（復旧中）	令和8年5月～7月頃（全延長供用）
⑤	141 -4.0m岸壁 （2～4工区） 130 -2.0m物揚場	暫定利用可	令和9年3月～5月頃（全延長供用）

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

石崎漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点



施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	40 -2m物揚場	他 利用不可	令和7年9月～11月頃（全延長供用）
②	41 D -2m物揚場	他 利用不可	令和8年4月～6月頃（全延長供用）
③	41 B -2m物揚場	他 暫定利用可	令和8年4月～6月頃（全延長供用）
④	45 船揚場	暫定利用可	令和9年1月～3月頃（全延長供用）
⑤	42 A -2m物揚場	利用不可	復旧方針検討中
⑥	43 A -2m物揚場	暫定利用可	復旧方針検討中
⑦	44 B -1.5m物揚場	暫定利用可	復旧方針検討中

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

舢倉島漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和6年9月30日時点



復旧完了 利用可能
