復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称
内灘町

時点
令和８年６月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表
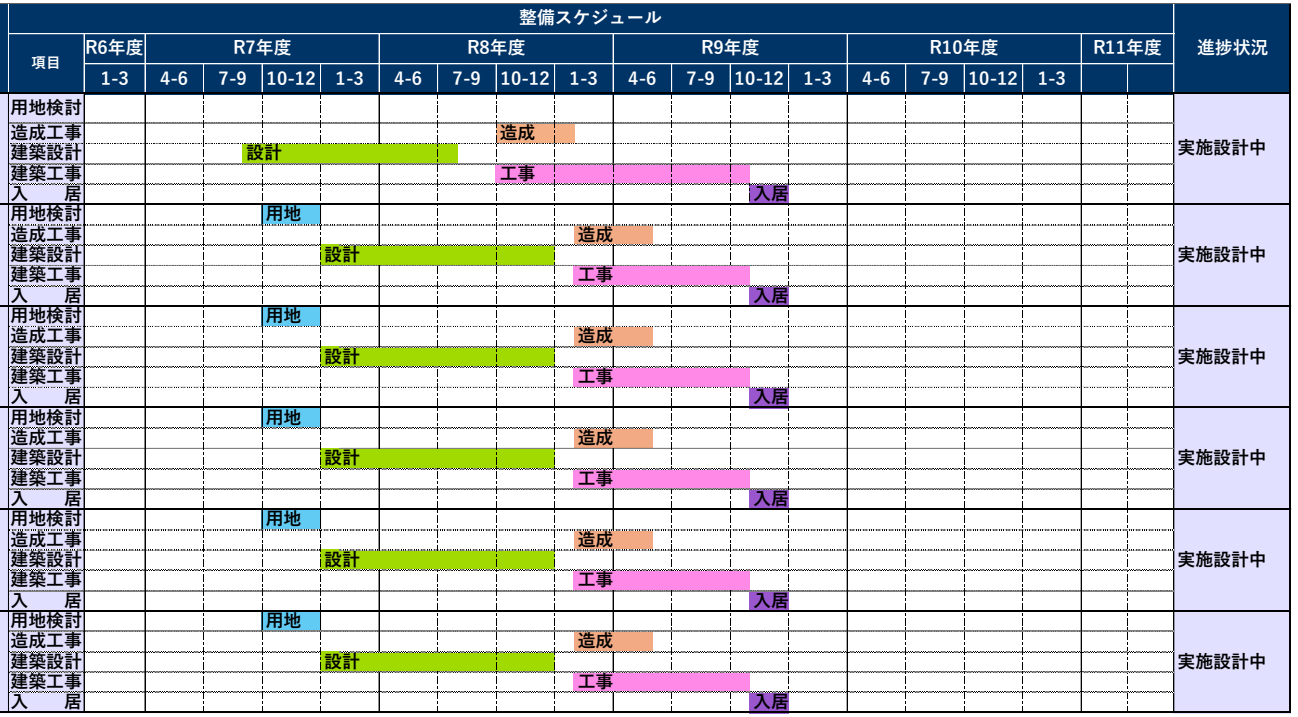
No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	進捗状況
1	鶴ケ丘地区	60戸	共同住宅	RC造 ３階	R9.秋 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　　居	実施設計中
2	宮坂地区①	20戸	戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　　居	実施設計中
3	宮坂地区②		戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　　居	実施設計中
4	西荒屋地区①	31戸	戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　　居	実施設計中
5	西荒屋地区②		戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　　居	実施設計中
6	室地区	18戸	戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　　居	実施設計中
