

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の運用基準

令和6年能登半島地震に伴う災害関連等工事の本格化に伴い、建設資材の調達環境がひっ迫し、受注者が、不足する建設資材を平常時よりも輸送費をかけて遠隔地から調達せざるを得ない場合において、建設資材の調達に要する購入費（現着の資材単価）及び輸送費を設計変更で計上することについて、必要な事項を定める。

1 対象工事（営繕工事は除く）

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の運用基準（以下「運用基準」という。）の対象となる工事は、次に掲げる事項をすべて満たす工事とする。

（1）石川県土木部が発注する工事

（2）令和6年1月4日以降に契約する工事若しくは、令和6年1月1日時点で契約中の工事。

2 対象建設資材等

本運用の対象となる建設資材等は、遠隔地※から調達せざるを得ない以下の資材等とする。

○購入費：生コンクリート、石材・骨材・土砂、アスファルト合材、コンクリート2次製品

○輸送費：仮設材（鋼矢板、敷鉄板等）

※遠隔地：購入費にあつては対象工事の単価地区以外の地域、輸送費にあつては平常時の輸送元が存在する地域より遠方の地域をいう

3 特記仕様書[共通編]への記載

発注者は特記仕様書[共通編]に「○」を付け対象工事であることを明示し、当該制度の手続き等を受注者が確認できるようにする。

4 設計変更の手続き

（1）受注者は、当初契約締結後において、安定的な確保を図るために、対象建設資材等を遠隔地から調達せざるを得なくなった場合には、工事現場に建設資材等を搬入する前までに監督員と以下の点について様式1にて協議するものとする。

①遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称

（使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」）

②遠隔地から資材を調達せざるを得ない理由

平常時の輸送元に、建設資材がないことを証明する資料※など

※平常時において出荷可能な3社以上の見積り依頼書及び辞退が明記された回答書等の原本

③製造・生産工場又は輸送基地を選定した理由

④建設資材の見積書（仮設材は不要）

⑤その他、監督員が必要と認めるもの

（2）発注者は様式2により協議の結果と、設計変更の対象とする資材および遠隔地からの建設資材調達に係る増加費用の概算を、受注者に通知する。

(3) 協議した建設資材の調達に係る支出実績を踏まえて設計変更する場合は、受注者は最終精算変更時点において、当該費用に関して実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）、使用証明資料（納品書等）を工事打合せ簿に添付して監督員に提出し、請負代金額の変更について協議するものとする。

なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

(4) 購入費（現着単価）は、受注者の購入価格（取引価格）とする。

(5) 輸送費は、基地（遠隔地）から現場までの距離について、積算基準及び標準歩掛により算出する。

(6) 購入した数量が契約計上数量（契約数量×ロス率（積算基準及び標準歩掛に記載されているものに限る））を上回った場合には、遠隔地から購入した数量のうち最後に購入したものから順次減算し、契約計上数量と同数になるまで調整を行うものとする。

6 全体スライド・単品スライド及びインフレスライドの併用

購入費及び輸送費に係る設計変更の協議をした場合においても、工事請負契約書第 26 条第 1 項から第 4 項（いわゆる「全体スライド」）、同条第 5 項（いわゆる「単品スライド」）、第 6 項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更を請求することができる。

附則

この運用基準は、令和 6 年 2 月 1 日から適用する。

この運用基準は、令和 6 年 7 月 1 日から適用する。

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更に係る特記仕様書

下記の建設資材については、安定的な確保を図るために、平常時よりも輸送費をかけて遠隔地から調達せざるを得ない場合は、事前に監督員と協議するものとする。

また、購入費（現着の資材単価）及び輸送費に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び石川県建設工事等入札参加資格に係る入札参加資格停止措置要領に基づき入札参加停止等の措置を行う場合がある。

○購入費の対象となる建設資材は、生コンクリート、石材・骨材・土砂、アスファルト合材、コンクリート２次製品とする。

○輸送費の対象は、仮設材（鋼矢板、敷鉄板等）とする。

〔協議〕

受注者は、遠隔地からの建設資材調達に要する購入費及び輸送費に係る設計変更を請求しようとする場合は、様式１に次の事項を添付し、発注者と協議すること。

①遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称
（使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」）

②遠隔地から資材を調達せざるを得ない理由

（平常時の輸送元に、建設資材がないことを証明する資料※など）

※平常時において出荷可能な３社以上の見積り依頼書及び辞退が明記された回答書等の原本

③製造・生産工場を選定した理由

④建設資材の見積書

⑤その他、監督員が必要と認めるもの

〔設計変更の協議〕

受注者は最終精算変更時点において、当該費用に関して実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）、使用証明資料（納品書等）を工事打合せ簿に添付して監督員に提出し、請負代金額の変更について協議すること。

様式－1

令和 年 月 日

石川県知事 殿

(受注者) 印

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について（協議）

標記について、建設資材等を遠隔地から調達せざるを得なくなったため、
特記仕様書に基づき設計変更を請求したいので、下記のとおり協議します。

記

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | 工 事 名 | |
| 2. | 協 議 | 設計変更を請求したいので、
関係書類を提出します。 |
| 3. | 添 付 書 類 | 別添のとおり |

.....

- (注)
- 1. 監督員に提出
 - 2. 以下の書類を添付する
 - ①遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称
（使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」）
 - ②遠隔地から資材を調達せざるを得ない理由
平常時の輸送元に、建設資材がないことを証明する資料※など
※平常時において出荷可能な3社以上の見積り依頼書及び辞退が明記された
回答書等の原本
 - ③製造・生産工場又は輸送基地を選定した理由
 - ④建設資材の見積書（仮設材は不要）
 - ⑤その他、監督員が必要と認めるもの

様式—2

令和 年 月 日

(受注者) 殿

石川県知事 印

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について（通知）

令和〇年〇月〇日付で協議のあった標記について、協議の結果及び増加費用を下記の通り通知します。

記

1. 工事名
2. 協議結果 碎石、アスファルト合材 etc について設計変更する。
3. 増加費用（概算） ¥2,000,000（税抜き）

.....

（注） 1. 通知にあたっては、知事名で行い所属長の決裁を得ること

遠隔地からの建設資材調達対策

概要

■遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

○令和6年能登半島地震に伴い被災地では、一部の建設資材の調達がひっ迫し、遠隔地（※）から輸送費をかけて調達しなければならないことが想定されることから、建設資材の調達に要する購入費及び輸送費を設計変更で計上するもの。


※遠隔地：購入費にあっては対象工事の単価地区以外の地域、輸送費にあっては平常時の輸送元が存在する地域より遠方の地域をいう

○当初設計は、標準積算、精算変更時に証明書類に基づき設計変更。（証明書類：領収書、使用証明資料等）


■対象建設資材

- ・購入費（現着）：生コンクリート、石材・骨材・土砂、アスファルト合材、コンクリート2次製品
- ・輸 送 費：仮設材（鋼矢板、敷き鉄板等）

【現状】

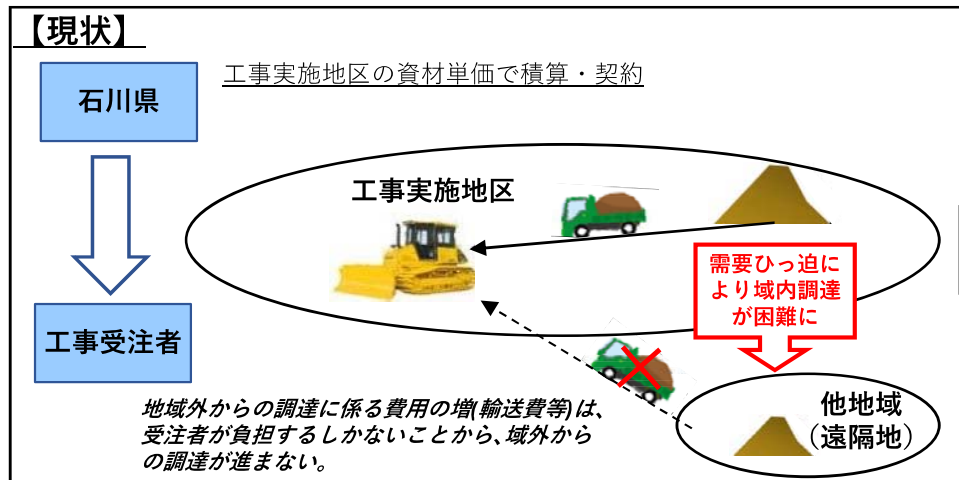

【対策】

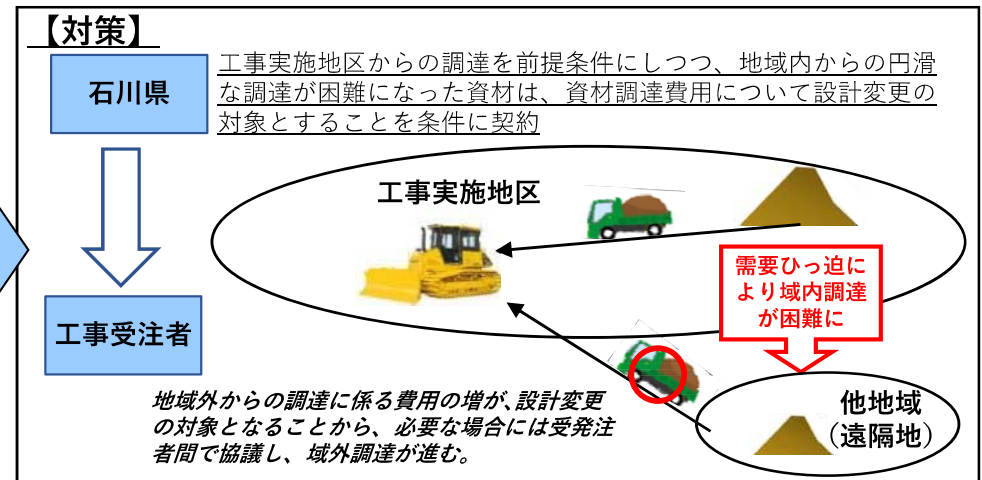

手続きの流れ

